

【软考达人】

软考资料免费获取

- 1、最新软考题库
- 2、软考备考资料
- 3、考前压轴题



微信扫一扫，立马获取



6W+ 免费题库



免费备考资料

PC版题库: ruankaodaren.com

系统集成项目管理工程师考试真题

2011 年上半年题+解析

- 以下对信息系统集成的描述不正确的是__(1)___。

(1) A . 信息系统集成包括总体策划、设计、开发、实施、服务及保障

B . 信息系统集成主要包括设备系统集成和应用系统集成

C . 信息系统集成是具有高技术含量的工程过程，要面向用户需求提供全面解决方案

D . 信息系统集成工作的核心是满足用户要求，管理和商务活动是系统集成项目实施成功的保证

【试题解析】

根据《系统集成项目管理工程师教程》第 81 页指出的系统集成项目特点，信息系统集成的根本出发点是满足用户要求。信息系统集成的核心工作技术，管理和商务活动是系统集成项目实施成功的保证。

该题的选项是 D。

- 计算机信息系统集成资质评定条件中规定：“对于申报信息系统集成资质二级以上资质的企业，需要 已建立完备的企业质量管理体系，通过国家认可的第三方认证机构认证并有效运行一年以上”。其中“国家认可”是指经过__(2)__认可的机构。

A . 工业和信息化部指定的系统集成资质评审机构

B . 国家质量监督检验检疫总局

C . 中国合格评定国家认可委员会

D . 工业和信息化部资质认证办公室

【试题解析】

中国合格评定国家认可委员会（英文缩写为：CNAS）是由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构，统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作。它是在原中国认证机构国家认可委员会（CNAB）和中国实验室国家认可委员会（CNAL）基础上合并重组而成的。

该题的选项是 C。

- 下列关于系统集成资质证书的叙述，正确的是__ (3) 。

A . 所有资质证书都由工业和信息化部审批

B . 系统集成一、二级资质证书由部级评审机构审批，三、四级由地方评审机构审批

C . 系统集成一、二级资质证书由工业和信息化部审批，三、四级由地方信息产业主管部门审批，报工业和信息化部备案

D . 系统集成一、二级资质证书由工业和信息化部及部级评审机构审批，三、四级由地方信息产业主管部门和地方评审机构审批

【试题解析】

系统集成一、二级资质证书由工业和信息化部审批，三、四级由地方信息产业主管部门审批。无论哪一级，通过审批后都要报工业和信息化部备案。

该题的选项是 C。

- 某企业的邮件服务器经常宕机，按照 IT 服务管理要求，为彻底解决该问题应启动 (4) 流程。

A. 事件管理 B. 问题管理 C. 发布管理 D. 变更管理

【试题解析】

事件管理是处理服务台所反应的、每天的、日常问题。通过事件管理，尽快恢复 IT 的正常服务。

问题是指：多个具有相同症状反复出现的事件、或者出现一个严重的未知根源的故障。

问题管理的目标是消除引起事件的深层次根源，以防事件再次发生，将事件对业务的影响降到最低程度。

该题的选项是 B。

- 以互联网为基础，将数字化、智能化的物体接入其中，实现自组织互联，是互联网的延

伸与扩展；通过嵌入到物体上的各种数字化标识、感应设备，如 RFID 标签、传感器、响应器等，使物体具有可识别、可感知、交互和响应的能力，并通过与 Internet 的集成实现物物相联，构成一个协同的网络信息系统。以上描述的是____(5)____。

A . 智慧地球 B . 三网融合 C . SaaS D . 物联网

【试题解析】

物联网，The Internet of things，简称 IOT，就是“物物相连的互联网”。

有两层含义：第一，物联网的核心和基础仍然是互联网，是在互联网基础上的延

伸和扩展的网络；第二，其用户端延伸和扩展到了任何物体与物体之间，进行信

息交换和通信。

物联网的定义：通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物体与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现物体的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。

该题的选项是 D。

- 模糊测试（Fuzz testing）是一种通过向目标系统提供非预期的输入并监视异常结果来发现软件漏洞的方法，是用于系统安全漏洞发掘的重要技术。模糊测试的测试用例通常是

(6)

(6) A. 预定数量的字符串 B. 预定长度的字符串

C. 模糊集的隶属度 D. 随机数据

【试题解析】

模糊测试是指将一个随机的、非预期的数据源作为程序的输入，然后系统地找出这些输入所引起的程序失效。通过模糊测试，你将会抢在别人之前来揭示软件易受攻击的弱点。模糊测试现在已经发展成为一种最有效的软件安全性测试方法。

该题的选项是 D

● 软件设计包括软件架构设计和软件详细设计。架构设计属于高层设计，主要描述软件的结构和组织，标识各种不同的组件。由此可知，在信息系统开发中，(7) 属于软件架构设计师要完成的主要任务之一。

(7) A. 软件复用 B. 模式设计 C. 需求获取 D. 需求分配

【试题解析】

架构师需要参与项目开发的全部过程，包括需求分析、架构设计、系统实现、集成、测试和部署各个阶段，负责在整个项目中对技术活动和技术说明进行指导和协调。

架构师主要职责有 4 条：

1、确认需求

在项目开发过程中，架构师是在需求规格说明书完成后介入的，需求规格说明书必须得到架构师的认可。架构师需要和分析人员反复交流，以保证自己完整并准确地理解用户需求。

2、系统分解

依据用户需求，架构师将系统整体分解为更小的子系统和组件，从而形成不同的逻辑层或服务。随后架构师会确定各层的接口，层与层相互之间的关系。架构师不仅要对整个系统分层，进行“纵向”分解，还要对同一逻辑层分块，进行“横向”分解。软件架构师的功力基本体现于此，这是一项相对复杂的工作

3、技术选型

架构师通过对系统的一系列的分解，最终形成了软件的整体架构。技术选择主要取决于软件架构。Web Server 运行在 Windows 上还是 Linux 上？数据库采用 MSSql、Oracle 还是 Mysql？需要不需要采用 MVC 或者 Spring 等轻量级的框架？前端采用富客户端还是瘦客户端方式？类似的工作，都需要在这个阶段提出，并进行评估。架构师对产品和技术的选型仅仅限于评估，没有决定权，最终的决定权归项目经理。架构师提出的技术方案为项目经理提供了重要的参考信息，项目经理会从项目预算、人力资源、时间进度等实际情况进行权衡，最终进行确认。

4、制定技术规格说明

架构师在项目开发过程中，是技术权威。他需要协调所有的开发人员，与开发人员一直保持沟通，始终保证开发者依照它的架构意图去实现各项功能。架构师与开发者沟通的最重要的形式是技术规格说明书，它可以是 UML 视图、Word 文档，Visio 文件等各种表现形式。通过架构师提供的技术规格说明书，保证开发者可以从不同角度去观察、理解各自承担

的子系统或者模块。架构师不仅要保持与开发者的沟通，也需要与项目经理、需求分析员，甚至与最终用户保持沟通。所以，对于架构师来讲，不仅有技术方面的要求，还有人际交流方面的要求。

参考答案：D

- 下列测试方法中，__ (8) __ 均属于白盒测试的方法。

- (8) A . 语句覆盖法和边界值分析法 B . 条件覆盖法和基本路径测试法
- C . 边界值分析法和代码检查法 D . 等价类划分和错误推测法

【试题解析】

白盒测试(White-box Testing，又称逻辑驱动测试、结构测试)是把测试对象看作一个打开的盒子。利用白盒测试法进行动态测试时，需要测试软件产品的内部结构 and 处理过程，不需测试软件产品的功能。白盒测试又称为结构测试和逻辑驱动测试。

白盒测试法的覆盖标准有逻辑覆盖、循环覆盖和基本路径测试。其中逻辑覆盖包括语句覆盖、判定覆盖、条件覆盖、判定/条件覆盖、条件组合覆盖和路径覆盖。

该题的选项是 B。

- 电子商务发展的核心与关键问题是交易的安全性，目前安全交易中最重要的两个协议是 (9) 。

A . S-HTTP 和 STT B . SEPP 和 SMTP

C . SSL 和 SET D . SEPP 和 SSL

【试题解析】

电子商务用到的安全协议有：

1. 安全套接层协议（SSL）

2. 安全电子交易协议（SET）

3. 增强的私密电子邮件（PEM）

4. 安全多用途网际邮件扩充协议（S/MIME）

5. 安全超文本传输协议（S-HTTP）

6. 三方域安全协议（3-D secure）

该题的选项是 C。

● 为了改进应用程序的可靠性和可维护性，并适应未来软硬件环境的变化，应主动增加新的功能以使应用系统适应各类变化而不被淘汰。为了适应未来网络带宽的需要，在满足现有带宽需求下，修改网络软件从而使之支持更大的带宽，这种软件维护工作属于

(10) 。

A.改正性维护

B . 适应性维护

C . 完善性维护

D . 预防性维护

【试题解析】

该题的选项是 D。《系统集成项目管理工程师教程》第 87 页指出：

软件维护包括如下类型：

- ① 更正性维护：软件产品交付后进行的修改，以更正发现的问题
- ② 适应性维护：软件产品交付后进行的修改，以保持软件产品能在变化后或变化中的环境中可以继续使用
- ③ 完善性维护：软件产品交付后进行的修改，以改进性能和可维护性
- ④ 预防性维护：软件产品交付后进行的修改，以在软件产品中的潜在错误成为实际错误前，检测和更正它们。

● 软件开发项目规模度量(size measurement)是估算软件项目工作量、编制成本预算、策划合理项目进度 的基础。在下列方法中，__(11)__可用于软件的规模估算，帮助软件开发团队把握开发时间、费用分布 等。

(11) A . 德尔菲法 B . V 模型方法 C . 原型法 D . 用例设计

【试题解析】

很明显，该题的选项是 A。

其他选项都不是估算软件规模的方法。

- 在信息系统集成项目中，经常使用 (12)__对集成的系统进行性能测试。

A . Bugzilla B . TestManager C . TrueCoverage D . LoadRunner

【试题解析】

很明显，只有选项 D 是对集成的系统进行性能测试的工具软件。

Bugzilla：缺陷管理工具

Truecoverage：覆盖率检查工具

TestManager：测试管理工具

Loadrunner：性能测试工具

- 根据《软件文档管理指南 GB/T 16680-1996》，关于软件文档的归档工作，下列说法中 (13) 是不正 确的。

(13) A . 软件文档必须在项目开发过程结束之后统一归档

B . 归档的文档应是经过鉴定或评审的

C . 文档应签署完整、成套、格式统一、字迹工整

D . 印制本、打印本以及各种报告应装订成册并按规定进行编号签署

【试题解析】

很明显，只有选项 A 是错的。

依据《软件文档管理指南 GB/T 16680-1996》之 9.6.1 文档归档 归档的文档应包括整个

软件生存期内所形成的全部文档 文档归档应满足以下条件：

- a) 归档的文档应是经过鉴定或评审的
- b) 文档应签署完整成套格式统一字迹工整
- c) 印制本打印本以及各种报告应装订成册并按规定进行编号签署软件文档应在开发过程每个阶段结束后及时归档

- 根据《中华人民共和国招标投标法》，以下做法正确的是 (14)。

(14) A .某项目于 2 月 1 日公开发布招标文件 , 标明截止时间为 2011 年 2 月 14 日 9 时整。

B . 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行

C . 某项目的所有投标都不符合招标文件要求 , 评标委员会在与招标方商量后 , 确定其中最接近投标文件要求的一家公司中标

D . 联合投标的几家企业中只需一家达到招标文件要求的资质即可

【试题解析】

很明显，只有选项 B 是对的。

依据是《中华人民共和国招标投标法》的第三十四条：

开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当

为招标文件中预先确定的地点。

- 某市政府采购办公用计算机及配套软件时进行了公开招标，以下做法正确的是

(15) 。

(15) A . 在招标文件中明确指出投标企业不应有外资背景

B . 该项目招标结束后，招标单位向中标人发出中标通知书，但对所有未中标的投标人只通知了中标结果

C . 某项目在招标时仅有一家企业投标，于是该企业顺利中标

D . 某项目的评标委员会由一名经济专家、一名技术专家和一名招标单位负责人组成。

【试题解析】

很明显，只有选项 B 是正确的。

依据是《中华人民共和国招标投标法》的第四十五条： 6 中标人确定后，招标人应当向中

标人发出中标通知书，并同时 will 中标结果通知所有未中标的投标人。

- 根据《中华人民共和国政府采购法》，以下做法正确的是 (16) 。

- ①某市民政局在进行政府采购的重新招标时，由于仅有两家企业的标的合格，于是报请本地采购监督管理部门批准将招标形式转为竞争性谈判
- ②某市民政局在进行政府采购的公开招标时，由于没有企业投标，于是报请本地采购监督管理部门批准将招标形式转为竞争性谈判
- ③某市民政局在进行政府采购的公开招标时，由于仅有一家企业的标的合格，于是报请本地采购监督管理部门批准将招标形式转为单一来源采购
- ④某县民政局在进行公开招标时连续两次出现流标，于是报请本地采购监督管理部门批准将招标形式转为竞争性谈判

(16) A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ②④

【试题解析】

很明显，只有选项 A 是正确的。

依据《中华人民共和国政府采购法》是第三十条：

符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本法采用竞争性谈判方式采购：

- (一) 招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；
- (二) 技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；
- (三) 采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；
- (四) 不能事先计算出价格总额的。

依据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条，符合下列情形之一的货物或者服务，

可以依照本法采用单一来源方式采购：

（一）只能从唯一供应商处采购的；

（二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；

（三）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，

且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

依据《中华人民共和国政府采购法》第七条，政府采购实行集中采购和分散采购相结合。

集中采购的范围由省级以上人民政府公布的集中采购目录确定。

属于中央预算的政府采购项目，其集中采购目录由国务院确定并公布；属于地方预算的

政府采购项目，其集中采购目录由省、自治区、直辖市人民政府或者其授权的机构确定并公

布。

● 在用例设计中，可以使用 UML 中的 (17) 来描述用户和系统之间的交互，说明系统功能行为。

(17) A . 类图 B . 构件图 C . 序列图 D . 部署图

【试题解析】

GUI 是 Graphical User Interface 的简称，即图形用户接口。

根据教程 P114，J2EE 应用服务器运行环境包括构件 (Component)、容器 (Container)

及服务 (Services) 三部分。构件是表示应用逻辑的代码；容器 7 是构件的运行环境；服务则是应用服务器提供的各种功能接口，可以同系统资源进行交互。

选项 B 是不正确的。

● 根据下面的 UML 类图，以下叙述中 (18) 是不正确的。

A . 容器是一个组件

B . GUI 组件就是一个容器

C . GUI 组件是一个对象

D . 容器和 GUI 组件都是组件

参考答案：B

● TCP/IP 协议族中的 (19) 协议支持离线邮件处理，电子邮件客户端可利用该协议下载所有未阅读的电子邮件。

A . FTP

B . POP3

C . Telnet

D . SNMP

【试题解析】

只有选项 B 是支持离线处理邮件的协议，POP3 是支持离线接受邮件的协议。

● 系统集成工程师小王为了查询其工作站的状态，在其工作站的命令行上运行 “ping 127.0.0.1” 命令，得到如下结果：

```
Pinging 127.0.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 127.0.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

关于以上查询结果，下列说法中，正确的是 (20) 。

- A . 小王的工作站正确安装了 TCP/IP 协议
- B . 小王的工作站访问了网关并收到响应
- C . 小王的工作站访问了 DNS 并收到响应
- D . 小王的工作站未正确安装网络硬件或驱动程序

【试题解析】：这说明小王的工作站正确安装了 TCP/IP 协议。

选项 A 是正确的。

- 某综合办公大楼的楼高 20 层，其综合布线系统一般采用的拓扑结构是 (21) 。

- A . 环型 B . 总线型 C . 分级星型 D . 星环型

【试题解析】

选项 B 是正确的。

- 依据《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2008），对于涉及国家秘密或企业对商业信息有保密要求的电子信息系统机房，应设置电磁屏蔽室。以下描述中，不符合该规范要求的是 ____ (22) ____。

(22) A . 所有进入电磁屏蔽室的电源线缆应通过电源滤波器进行

B . 进出电磁屏蔽室的网络线宜采用光缆或屏蔽线缆线，光光缆应带有金属加强芯

C . 非金属材料穿过屏蔽层时应采用波导管，波导管的截面尺寸和长度应满足电磁屏蔽的性能要求。

D . 截止波导通风窗内的波导管宜采用等边六角形，通风窗的截面积应根据室内换气次数进行计算。

【试题解析】

选项 B 是不符合要求的，请参见《电子信息系统机房设计规范》

（GB50174-2008）： 9.3.5 进出电磁屏蔽室的网络线宜采用光缆或屏蔽线缆，

光缆不应带有金属加强芯。

- 某公司有一台 Linux 文件服务器，多台 Windows 客户端和 Linux 客户端。要求任意一个客户端都可以共享服务器上的文件，并且能够直接存取服务器上的文件。客户端和服务端间应该使用__(23)协议。

(23) A . NFS

B . Samba

C . FTP

D . iSCSI

【试题解析】

选项 B 是符合要求的。Samba 是一个能让你的 Unix 计算机和其它 MS Windows 计算机相互共享资源的软件。Samba 提供有关资源共享的三个功能，包括：Smbd，执行它可以使 Unix 能够共享资源给其它的计算机；而 Smbclient 就是让 Unix 去存取其它计算机的资源；最后一个 Smbmount，则是类似 MS Windows 下“网络磁盘驱动器”的功能，可以让你把其它计算机的资源挂在自己的档案系统下。它们功能虽然简单，但没有 Samba，Unix 和 Windows 的资源就很难共享。Samba 的功能十分实用，虽然没用亮丽的外表，但在局域网络中，它的确是一个很重要的工具。

- 根据《电子信息系统机房设计规范 GB50174-2008》，电子信息系统机房应对人流和出入口进行安全考虑，以下叙述错误的是 (24) 。

- A．建筑的入口至主机房应设通道，通道净宽不应小于 1.5m
- B．电子信息系统机房宜设门厅、休息室、值班室和更衣间
- C．电子信息系统机房应有设备搬入口
- D．电子信息系统机房必须设置单独出入口

【试题解析】

选项 D 是错误的。根据《电子信息系统机房设计规范 GB50174-2008》的“6.2

人流、物流及出入口”之如下规定：

6.2.1 主机房宜设置单独出入口，当与其它功能用房共用出入口时，应避免人流、物流的交叉。

6.2.2 有人操作区域和无人操作区域宜分开布置。

6.2.3 电子信息系统机房内通道的宽度及门的尺寸应满足设备和材料运输要求，建筑的入口至主机房应设通道，通道净宽不应小于 1.5m。

6.2.4 电子信息系统机房宜设门厅、休息室、值班室和更衣间，更衣间使用面积应按最大班人数的每人 1~3 m²计算。注意上述说法是“宜”，而不是“必须”。

- 信息安全的级别划分有不同的维度，以下级别划分正确的是 (25)。

(25) A . 系统运行安全和保密有 5 个层次，包括设备级安全、系统级安全、资源访问安全、功能性安全和数据安全

B . 机房分为 4 个级别：A 级、B 级、C 级、D 级

C . 根据系统处理数据划分系统保密等级为绝密、机密和秘密

D . 根据系统处理数据的重要性，系统可靠性分 A 级和 B 级。

【试题解析】

选项 C 是正确的。具体内容请参考《系统集成项目管理工程师教程》P451。

- 系统运行安全的关键是管理，下列关于日常安全管理做法，不正确的是 (26)。

(26) A . 系统开发人员和系统操作人员应职责分离

- B. 信息化部门领导安全管理组织，一年进行一次安全检查
- C. 用户权限设定应遵循“最小特权”原则
- D. 在数据转储、维护时要有专职安全人员进行监督

【试题解析】

选项 B 是不正确的。具体内容请参考《系统集成项目管理工程师教程》P450，应由单位领导牵头负责而不应部门领导。

- 在某次针对数据库的信息安全风险评估中，发现其中对财务核心数据的逻辑访问密码长期不变。基于以上现象，下列说法正确的是__(27) 。

- A. 该数据不会对计算机构成威胁，因此没有脆弱性
- B. 密码和授权长期不变是安全漏洞，属于该数据的脆弱性
- C. 密码和授权长期不变是安全漏洞，属于对该数据的威胁
- D. 风险评估针对设施和软件，不针对数据

【试题解析】

选项 B 是正确的。威胁可看成从系统外部对系统产生的作用，而导致系统功能及目标受阻的所有现象。而脆弱性则可以看成是系统内部的薄弱点。脆弱性是客观存在的，脆弱性本身没有实际的伤害，但威胁可以利用脆弱性发挥作用。系统的风险可以看做是威胁利用了脆弱性而引起的。常见的脆弱性有：“密码和授权长期不变”、“错误的选择和使用密码”。

● Web 服务(web service)的主要目标是跨平台的操作性，它有许多适用场合。但某些情况下，Web 服务也会降低应用程序的性能。下列情况中， (28)不适合采用 Web 服务作为主要的系统集成技术。

(28) A . B2B 集成

B . 集成不同语言编写的在不同平台上运行的应用程序

C . 跨越防火墙

D . 构建单机应用程序

【试题解析】

该题的选项是 D。具体内容请参考《系统集成项目管理工程师教程》P113。

● J2EE 的四层体系架构(客户层/ 表示层/ 业务逻辑层/ 数据层) 中，可用来实现业务逻辑层的技术是 (29) 。

A . Internet Explore B . Database C . Enterprise JavaBean D . Servlet

【试题解析】

该题的选项是 C。

按着 Sun 公司的定义，JavaBeans 是一个可重复使用的软件组件。实际上 JavaBeans 是一种 Java 类，通过封装属性和方法成为具有某种功能或者处理某个业务的对象，简称

beans。由于 Javabeans 是基于 Java 语言的，因此 Javabeans 不依赖平台，具有以下

特点：

1. 可以实现代码的重复利用

2. 易编写、易维护、易使用

3. 可以在任何安装了 Java 运行环境的平台上的使用，而不需要重新编译。

而 Servlet 是一个 Java 编写的程序，此程序是在服务器端运行的。Servlet

是处理客户端的请求并将其结果发送到客户端，具有独立于平台和协议的特性，

可以生成动态的 Web 页面。它担当客户请求（Web 浏览器或其他 HTTP 客户程序）

与服务器响应（HTTP 服务器上的数据库或应用程序）的中间层。

- 某项目组需要在 Windows 操作系统平台上用 C++ 语言编写应用构件，该项目组宜选用 (30) 作为构件标准。

(30) A. COM+ B. EJB C. OMG D. ODBC

【试题解析】

很明显，该题的选项是 A。

- 项目经理在编制项目管理计划时，应 (31) 。

(31) A. 越简单越好 B. 越详细越好
C. 逐步细化 D. 按照公司的模板编制，不能变更

【试题解析】

选项 C 是正确的。具体内容请参考“滚动波式计划”方法

- 在项目整体管理过程中监督和控制项目是一个关键环节，下列不属于监督和控制过程组的是 (32) 。

(32) A. 客户等项目干系人正式验收并接受已完成的项目可交付物的过程
B. 企业质量管理体系审计
C. 在管理项目团队时，项目经理与组员就组员情况进行正式交谈
D. 编制绩效报告

【试题解析】

选项 B 是企业级行为，选项 B 不属于项目的监控过程。选项 C 属于“管理项目团队”这一日常的监控过程。

- 项目经理王某对其负责的系统集成项目进行了成本估算和进度安排，根据团队成员的情


况分配了任务，并制定出计划执行预算成本的基准。由于公司高层领导非常重视该项目，特地调配了几名更有经验（薪水更高）的技术骨干参与项目，这种变化对项目绩效造成的最可能影响是 ____ (33) ____。

- (33) A . 正的成本偏差 CV，正的进度偏差 SV
 B . 负的成本偏差 CV，正的进度偏差 SV
 C . 正的成本偏差 CV，负的进度偏差 SV
 D . 负的成本偏差 CV，负的进度偏差 SV

【试题解析】

对项目绩效造成的最可能影响是选项 B。盖因几名更有经验（薪水更高）的技术骨干可能有成本超支的风险，但也有进度提前的收益。

- 依据下面的项目活动网络图中，该项目历时为 ____ (34) ____ 天。

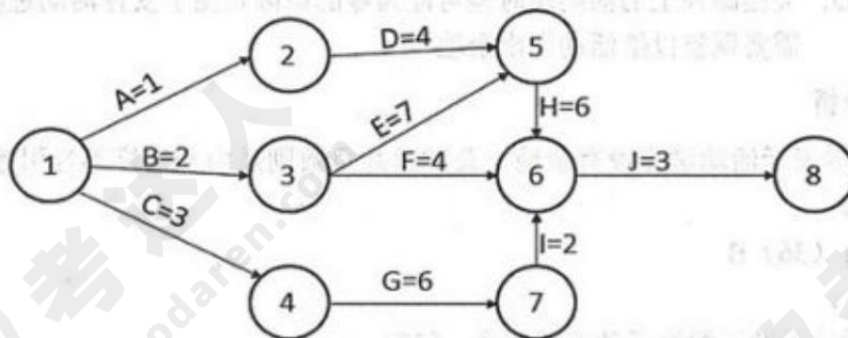

- (34) A . 10 B . 11 C . 13 D . 14

参考答案：选择 D

想过

系统集成项目管理工程师考试真题

2011年上半年上午题（带答案）

练好真题，快速掌握，详细解析！

- ★ 本资料有：《每天一小时，两月拿证》助理整理。
- ★ 资料来自网络，无版权，无销售。供复习试用。
- ★ 欢迎大学多多指点和反馈错误和不足。
- ★ 更多资料可到www.1634.com.cn网页上方加QQ群下载。



打开网站→



←关注微信，下载打包真题。

←推送每章习题，特色练习。

- 下列 (35) 做法不属于进度压缩。

(35) A. 某项目经理发现项目工期延后，于是开始让项目组成员开始加班加点，提高加班工资，以期待能在规定时间内完成项目

B. 某项目经理发现项目组成员由于对技术的掌握不熟练，造成进展缓慢，延误工期，于是指派了有经验的人员帮助完成。

C. 为了节省时间，在需求设计还没有完成时，项目经理就通知组内编程人员开始编写代码

D. 项目经理启用应急时间来增加一些项目时间。

【试题解析】

选项 D 不属于进度压缩，属于“应急时间”或“时间储备”以对付进度风险。

其他选项都属于进度压缩技术。

- 出现“关键路径上的活动总时差是零和负数”情况下，下列分析正确的是 (36) 。

(36) A. 关键路径上的活动总时差可能为零的原因是每个相邻活动都是紧前或紧后的，需要调整以给活动留出时间余地

B. 关键路径上的活动总时差可能为负的原因是由于安排调配不得当所造成的活动非合理性交错现象，有必要调整活动持续时间、逻辑关系等使得活动总时差为零

C. 关键路径上的活动总时差可能为负的原因是因为用最早时间减去最晚时间，不需

要调整以给活动留出余地

D．关键路径上的活动总时差可能为零的原因是由于安排活动进度没有余地，需要调整以给活动留出余地

【试题解析】

选项 B 是正确的。其他三个选项，逻辑上均有明显的错误

- 下列做法无助于缩短活动工期的是 (37) 。

(37) A．投入更多的资源以加快活动进程 B．减小活动范围或降低活动要求

C．通过改进方法或者技术提高生产率 D．采用甘特图法

【试题解析】

选项 A、B、C 均属于进度压缩技术，而选项 D 不属于。选项 D 无助于缩短活动工期。

- 下列关于工作分解结构（WBS）的叙述中，错误的是 (38) 。

(38) A．项目经理在分解结构时，严格地将一个工作单元隶属于某个上层工作单元，完全避免交叉从属。

B．项目管理部依照项目经理分解的 WBS 进行项目成本估算，但最后发现成本超过预计投资

C . 项目经理将项目管理工作也编制成为 WBS 的一部分

D . 项目经理在执行某复杂项目时，在项目开始阶段一次性将项目分解成为精确的 WBS，最后按计划完成了任务，受到领导好评

【试题解析】

选项 A、B、C 的叙述均适当，而选项 D 的叙述是错误的。根据“滚动波式计划”方法，WBS 的分解也是渐进明细的。

● 在某信息化项目建设过程中，客户对于最终的交付物不认可，给出的原因是系统信号强度超过用户设备能接受的上限。请问在项目执行过程中，如果客户对于项目文件中的验收标准无异议，则可能是 (39) 环节出了问题；如果客户对于项目文件中的验收标准有异议，而项目内所有工作流程均无问题，则可能是 (40) 环节出了问题。

(39) A . 质量控制 B . WBS 分解过程 C . 变更控制 D . 范围确认

(40) A . 质量控制 B . WBS 分解过程 C . 变更控制 D . 范围确认

【试题解析】

(39) 客户对于最终的交付物不认可，原因是系统信号强度超过用户设备能接受的上限。如果客户对于项目文件中的验收标准无异议，则可能是选项 A 出了问题。

(40) 如果客户对于项目文件中的验收标准有异议，而项目内所有工作流程均无问题，则可能是选项“D. 范围确认”出了问题。

应该是 A，现更正如下：

(39) 客户对于最终的交付物不认可，原因是系统信号强度超过用户设备能接受的上限。

如果客户对于项目文件中的验收标准无异议，则可能是选项“A. 质量控制”出了问题。

参考答案：(39)，A (40)，D

● 在项目管理领域，经常把不受控制的变更称为项目“范围蔓延”。为了防止出现这种现象，需要控制变更。批准或拒绝变更申请的直接组织称为①，定义范围变更的流程包括必要的书面文件、②和授权变更的批准等级。

(41) A. ①变更控制委员会；②纠正行动、跟踪系统

B. ①项目管理办公室；②偏差分析、配置管理

C. ①变更控制委员会；②偏差分析、变更管理计划

D. ①项目管理办公室；②纠正行动、配置管理

【试题解析】

定义范围变更的流程包括必要的书面文件(如变更申请单)、纠正行动、跟踪系统和授权变更的批准等级。变更控制系统与其他系统相结合，如配置管理系统来控制项目范围。当项目受合同约束时，变更控制系统应当符合所有相关合同条款。

参考答案：A

- 某公司按照项目核算成本，在针对某化工厂信息化咨询项目中，需进行 10 天的驻场研究，产生成本 如下：①公司管理费用的项目分摊成本；②咨询顾问每人每天出差补贴 500 元，入工资结算；③顾问如 需进入生产车间，每人额外增加健康补助 100 元/天。按照成本类型分类，上述三类成本应分别列入 ____ (42) ____ 。

(42) A . ①间接成本 ②间接成本 ③可变成本

B . ①间接成本 ②直接成本 ③可变成本

C . ①直接成本 ②直接成本 ③固定成本

D . ①直接成本 ②间接成本 ③固定成本


【试题解析】

批准或拒绝变更申请的直接组织称为①变更控制委员会 CCB，定义范围变更

的流程包括必要的书面文件、②纠正行动、跟踪系统和授权变更的批准等级。正

确的选项是 A。

- 挣值管理是一种综合了范围、时间、成本绩效测量的方法，通过与计划完成的工作量、实际挣得的收益、实际的成本进行比较，可以确定成本进度是否按计划执行。下图中标号所标示的区间依次应填写 ____ (43) ____ 。

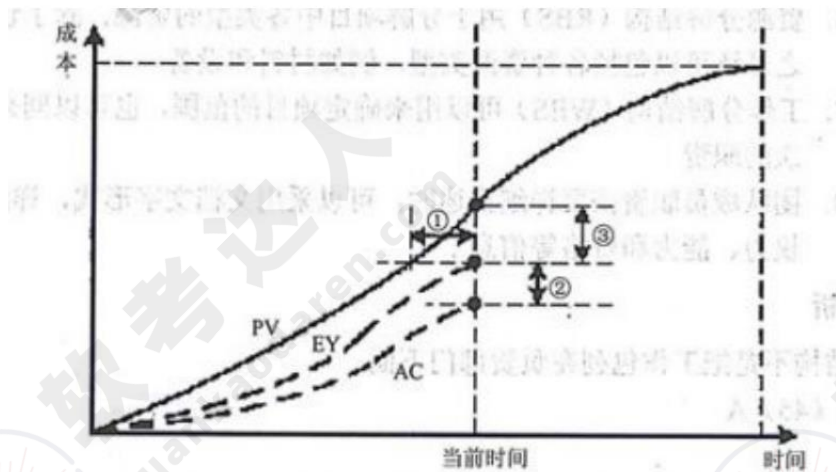

(43) A. ①进度落后 ②成本差 CV ③进度差 SV

B. ①成本差 CV ②进度差 SV ③进度落后时间

C. ①进度差 SV ②成本差 CV ③进度落后时间

D. ①进度落后 ②进度差 SV ③成本差 CV

【试题解析】

项目成本管理，成本偏差 $CV = EV - AC$ ，进度偏差 $SV = EV - PV$ 。选项 C 是正确的

- 某信息化施工项目一共要进行 30 天，预算总成本 60 万元，其中 5 万元为管理成本，40 万元为物料使用费，其余为人工成本。按照管理计划，每 5 天进行一次挣值分析以评价项目绩效。在第 5 天绩效评价时计算得到 CPI (绩效评价指数) 为 0.95，则说明在前 5 天的施工中，实际成本①预算成本；如果要使下一次绩效评价时 CPI 为 1，且人工、物料使用成本不能改变，以免影响施工质量，则在这两次绩效评价间，每天平均可花费的管理成本为②元。上述①和②依次序应该填写 (44) (假设所有成本按照天数平均分配，

工程进度不存在延时或提前情况)。

(44) A. ①低于 ②614 元

B. ①高于 ②614 元

C. ①低于 ②1052 元

D. ①高于 ②1052 元

【试题解析】

这题容易，选项 B 是正确的。CPI=0.95，则说明在前 5 天的施工中，实际成本高于预算成本。因假设所有成本按照天数平均分配，工程进度不存在延时或提前情况，所以 SPI=1。

因此 $EV = PV$ ，

前 5 天的 $AC = EV / CPI = PV / CPI = 10 / 0.95 = 10.5263$

因下一次要 CPI=1，后 5 天的 AC 理应 $= 20 - 10.53 = 9.4737$

后 5 天的管理费理应 $= 9.47 - 5 * (60 - 5) / 30 = 0.3070$

后 5 天，每天的管理费 $= 0.3070 \text{ 万元} / 5 = 614 \text{ 元}$

- 下列工具或方法均可用来描述项目组织，以下说法中，不正确的是 (45)。

(45) A. 组织分解结构 (OBS) 与工作分解结构 (WBS) 形式上相似，是根据项目的交付物进行分解，把项目的活动和工作包列在负责的部门下面

B . 资源分解结构 (RBS) 用于分解项目中各类型的资源，除了包含人力资源之外还可以包括各种资源类型，例如材料和设备

C . 工作分解结构 (WBS) 可以用来确定项目的范围，也可以同来描述不同层次的职责

D . 团队成员职责需要详细描述时，可以采用文档文字形式，详细提供职责、权力、能力和资格等信息

【试题解析】

选项 A 是不正确的。组织分解结构(OBS)与工作分解结构(WBS)形式上相似，但是它不是根据项目的交付物进行分解，而是根据组织现有的部门、单位或团队进行分解。

- 在进行项目团队的激励时，一般不会采用的方法是 ____ (46) ____ 。

(46) A . 马斯洛的需要层次理论 B . 赫兹伯格的双因素理论

C . 人际网络管理 D . 期望理论

【试题解析】

据项目管理工程师教程，项目团队激励时，可使用的有马斯洛需求理论、赫茨伯格的双因素理论、期望理论。

选项 C 不属于激励理论。

- 下列关于冲突及其解决方式的描述中，不正确的是 ____ (47) ____ 。

(47) A . 冲突是自然的团队问题，不是某人的个人问题

B . 冲突的产生原因有项目的高压环境、责任划分不清楚、存在多个上级或者新科技的使用等

C . 冲突的解决方法有合作、强制、妥协等，但不能将冲突搁置起来，从中撤退

D . 冲突应早被发现，利用私下但直接的、合作的方式来处理冲突

【试题解析】

选项 C 是不正确的。可以将冲突搁置起来，也可以从中撤退

- 某项目在招标时被分成 5 个标段，分别发包给不同的承包人。承包人中标后与招标人签订的是 ____ (48) ____ 。

(48) A . 单项项目承包合同

B . 分包合同

C . 单价合同

D . 总承包合同

【试题解析】

按信息系统范围划分的合同类型有：总承包合同、单项项目承包合同和分包合同

选项 A 是正确的。

- 甲公司在进行采购时选定了乙公司的产品，但在签订采购合同时没有对采购内容的交付时间进行约定，则以下说法错误的是 (49) 。

- A . 可以通过协议或交易习惯确定交付时间
- B . 不能通过协议或交易习惯确定的，则采购合同无效
- C . 乙公司可以随时履行交付义务
- D . 甲公司可以随时要求乙公司履行交付义务

【试题解析】

合同法第四章第六十二条第四款:履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。

选项 B 是错误的。

- 某项目甲乙双方签订了建设合同，其中对工程款支付及知识产权的描述分别是

“.....甲方在系统安装完毕，经试运行及初验合格后，收到乙方材料 xx 日内.支付第二笔款 xxxx 元.乙方提供的材料包括:①商业发票:②.....”，从上述描述可看出，支付第二笔款还必须附加的材料是 (50) 。

- A . 第三方测试报告 B . 初验报告 C . 专家评审报告 D . 监理工作总结报告

【试题解析】

从题干“经试运行及初验合格后”则应该提供“初次报告”，可知选项 B 是正确的。

- 某项目经理在进行成本估算时采用 (51) 方法，制定出如下的人力资源成本估算表。

称	数	费 / 时	单 员 时数	费
项目经理	1	50	500	25000
需求人员	2	25	300	15000
分析人员	2	35	500	35000
程序员	3	20	1000	60000
测试人员	2	25	700	35000
合计				170000

- A . 类比估算 B . 自下而上的估算 C . 参数估算 D . 成本汇总

【试题解析】

项目论证的内容包括项目运行环境评价、项目技术评价、项目财务评价、项目国民经济评价、项目环境评价、项目社会影响评价、项目不确定性和风险评价、项目综合评价等。

很明显，是选项“C . 参数估算”。

- 下列关于项目型组织优缺点的描述中，不正确的是 (52) 。

- A . 项目型组织结构单一，责权分明，利于统一指挥
- B . 项目型组织管理成本较低，项目环境利于沟通和知识共享
- C . 项目型组织沟通简洁、方便，目标明确单一，决策快
- D . 项目型组织的员工缺乏事业上的连续性和保障

【试题解析】

在项目型组织中各专业的员工是分散在各项目中的，是不方便知识共享的，

选项 B 是不正确的。

- 以下关于信息系统集成项目的特点描述不正确的是 (53) 。

(53) A . 信息系统集成项目要以满足用户和客户的需求为根本出发点

B . 信息系统集成项目更加强调了沟通的重要性，技术的集成需要以最前沿技术的合理应用为基础

C . 信息系统集成项目是高新技术与高新技术的集成，但同时也蕴藏着没有完全掌握新技术带来的风险

D . 信息系统集成项目团队年轻、流动率高，因此对于企业的管理技术水平和项目经理的领导艺术水平要求较高 系统集成是指将计算机软件、硬件、网络通信等技术和产品集成成为能够满足用户特定需要的信息系统，包括 总体策划、设计、开发、实施、服务及保障。

【试题解析】

系统集成不是选择最好的产品的简单行为，而是要选择最适合用户的需求和投资规模的产品和技术。

很明显，选项 B 是不正确的

- 一般情况下，随着项目的逐渐进展，成本和人员投入水平呈现出①的态势，而项目干系人对于项目最终产品的特征和项目最终费用的影响会②，变更和缺陷修改的费用通常会③。

①、②和③分别是____ (54) 。

(54) A . ①先增后减，②逐渐减小，③逐渐增加

B . ①先减后增，②逐渐增加，③逐渐减少

C . ①先增后减，②逐渐增加，③逐渐增加

D . ①先减后增，②逐渐减少，③逐渐减少

【试题解析】

一般情况下，随着项目的逐渐进展，成本和人员投入水平呈现出“①先增后减”的态势，而项目干系人对于项目最终产品的特征和项目最终费用的影响会“②逐渐减小”，变更和缺陷修改的费用通常会“③逐渐增加”。因此①、②和③的正确组合是选项 A。

- 项目识别是承建方项目立项的第一步，其目的在于选择投资机会、鉴别投资方向。以下关于项目识别的说法不正确的是 (55) 。

A . 可从政策导向中寻找项目机会，主要依据包括国家、行业和地方科技发展和经济社会发展的长期规划与阶段性规划

B . 市场需求是决定投资方向的主要依据，投资者应从市场分析中选择项目机会

C . 信息技术发展迅速、日新月异，新技术也会给企业带来新的项目机会

D . 对项目的市场风险、技术风险、经济及社会风险等因素进行分析，为项目全过程的风险管理提供依据

【试题解析】

项目识别目的在于选择投资机会、鉴别投资方向，一般从从政策导向中寻找项目机会、从市场需求中选择项目机会、从新技术发展中项目机会。很明显，选项 D 是项目机会已经确定之后的事情，是分析项目风险、为管理项目风险提供依据的。

参考答案：D

- 项目承建方在立项管理过程中，应从多个角度对项目进行论证，以下通常不属于承建方项目论证内容的是 (56) 。

(56) A . 技术可行性分析 B . 财务可行性分析
C . 风险分析 D . 需求验证

【试题解析】

项目论证的内容包括项目运行环境评价、项目技术评价、项目财务评价、项目国民经济评价、项目环境评价、项目社会影响评价、项目不确定性和风险评价、项目综合评价等。

很明显，选项 D 不属于项目论证的内容

- 某地方政府策划开展一项大型电子政务建设项目，项目建设方在可行性研究的基础上开展项目评估，以下做法不正确的是 ____ (57) ____ 。

(57) A. 项目建设方的相关领导和业界专家，根据国家颁布的政策、法规、方法、参数和条例等，进行项目评估

B. 从项目、国民经济、社会角度出发，对拟建项目建设的必要性、建设条件、生产条件、产品市场需求、工程技术、经济效益和社会效益等进行评价、分析和论证，进而判断其是否可行。

C. 项目评估按照成立评估小组、制定评估计划、开展调查研究、分析与评估、编写评估报告的 程序开展。

D. 评估工作采用费用效益分析法，比较为项目所支出的社会费用和项目对社会所提供的效益，评估项目建成后将对社会做出的贡献程度。。

【试题解析】

在编制采购计划的过程中，首先要确定项目的哪些产品、成果或服务自己提供更合算，还是外购更合算？这就是“自制/外购”决策，在这个过程中可能要用到专家判断，最后也要确定合同的类型，以转移风险。

在进行“自制/外购”决策时，有时项目的执行组织可能有能力自制，但是可能与其他项目有冲突或自制成本明显高于外购，在这种情况下项目需要从外部采购，以兑现进度承诺。任何预算限制都可能是影响“自制/外购”决定的因素。如果决定购买，还要进一步决

定是购买还是租借。“自制/外购”分析应该考虑所有相关的成本，无论是直接成本还是间

接

成本。例如，在考虑外购时，分析应包括购买该项产品的实际支付的直接成本，也应包括

购买过程的间接成本。

RFP 是采购文档的一种形式，是编制询价计划过程的成果之一，制订 RFP 文件时编制询价计划过程的工作。

投标人会议(也称为发包会、承包商会议、供应商会议、投标前会议或竞标会议)是指在准备建议书之前与潜在供应商举行的会议。投标人会议用来回答潜在卖方的问题，确保所有潜在供应商对采购目的(如技术要求和合同要求等)有一个清晰、共同的理解。对供应商问题的答复可能作为修订条款包含到采购文件中。

供方选择过程在向每一个选中的供方提供一份合同前，应当先制定合同。

参考答案：A

- 某企业在项目实施过程中，为降低项目成本、更好的满足客户需求，按照以下流程对项目所需的部分 产品进行了采购：

①记录项目对于产品、服务或成果的需求，并且寻找潜在的供应商；

②从供应商处获取相关信息、报价和建议书；

③审核所有建议书，在供应商中进行选择，并与选中者谈判签订最终合同；

④管理合同以及买卖双方的关系，并管理与合同相关的变更。该企业的采购流程缺少了(58)环节。

A．编制采购计划 B．编制询价计划

C．询价、招投标 D．合同管理和收尾

【试题解析】

项目采购管理不仅包括合同管理和变更控制过程，也要执行合同中约定的项目团队应

承担的合同义务。采购管理包括如下几个过程：

(1)编制采购计划。(2)编制询价计划。(3)询价、招投标。

(4)供方选择。(5)合同管理和收尾。

参考答案：A

● 某大型系统集成项目进行公开招标，要求投标人具有计算机系统集成二级资质，甲、乙两家企业为提高竞争力、增加投标成功的可能性，组成联合体以一个投标人的身份共同投标，如出现以下(59)情况，甲、乙两家企业组成的联合体将无法满足该项目的招标要求。


(59) A．甲、乙两家企业共同按照招标文件的要求编制投标文件，对招标文件提出的实质性要求和条件作出了响应

- B. 甲企业具有计算机系统集成二级资质，乙企业具有计算机系统集成三级资质
- C. 甲、乙两家企业签订了共同投标协议，并将该协议连同投标文件一并提交招标人
- D. 甲、乙两家企业经过协商，对招标项目提出了略低于市场价格的报价

【试题解析】

很明显，选项 B 是有问题的：这是因为招投标法规定，投标联合体的资质 = 联合体中最低一方的资质。

- 在管理信息系统的开发过程中用到很多图表，对这些图表进行有规则的编号，可以方便图表的查找。根据生命周期的 5 个阶段，可以给出下图所示的分类编号规则，其中第 3、4 位应该表示（60）。

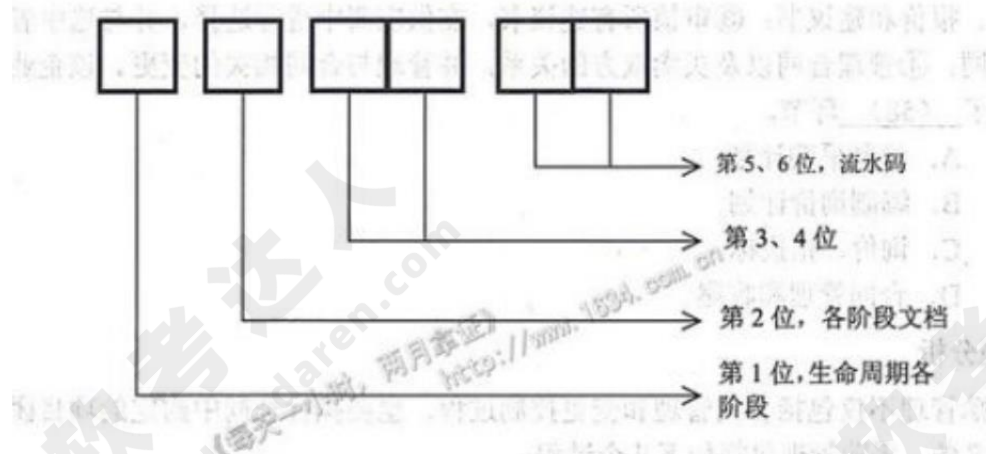

- (60) A. 文档页数 B. 文档编号 C. 文档内容 D. 文档目录

参考答案：C

- 软件开发项目中的很多过程产出物都属于配置项，一般意义上来讲，以下可以不作为配置项的是__ (61) __。

- A . 项目计划书

B . 需求文档
- C . 程序代码

D . 会议记录

【试题解析】

产品配置是指一个产品在其生命周期各个阶段所产生的各种形式和各种版本的文档、计算机程序、部件及数据的集合。该集合中的每一个元素称为该产品配置中的一个配置项，典型的配置项有项目计划书、需求文档、设计文档、源代码、测试用例等。

很明显，选项 “D.会议记录” 可以不作为配置项。

- 某系统集成企业为做好项目配置管理，对配里库中的操作权限进行了以下定义。

同时，对项目相关人员在该产品库中的操作权限进行了如下分配，其中 √ 表示该人员具有相应权限，X 表示该人员没有相应权限，则产品库权限分配表中用①②③④⑤标出的位里，应填写的内容为_ 62 _。

权	内容
Read	可以读取文件内容，但不能对文件进行变更
Check	可使用[checkin]等命令，对文件内容进行变更
Add	可使用[文件的追加]、[文件的重命名]、[删除]等命令
Destroy	有权进行文件的不可逆毁坏、清除、rollback 等命令

Release(产 品库)					
人员	项目经理	项目成员	QA	测试人员	配置管理员
权限					
Read	√	√	√	√	√

Check	①	②	③	④	⑤
Add	×	×	×	×	√
Destroy	×	×	×	×	√

则产品库权限分配表中用①②③④⑤标出的位置，应填写的内容为_____ (62)_____。

(62) A. ①√；②×；③×；④√；⑤√

B. ①×；②×；③×；④×；⑤√

C. ①√；②√；③√；④×；⑤√

D. ①×；②√；③×；④×；⑤√

【试题解析】

配置项的操作权限由配置管理员 CMO 严格管理，基本的原则是：基线配置项 向
开发人员开发读取权限；非基线配置项向项目经理、变更控制委员会 CCB 及相

关人员开放。配置管理里部分角色的权限如下：

(1) 项目经理：是整个软件研发活动的负责人，他根据软件配置控制委员 会的建
议批准配置管理的各项活动并控制它们的进程。其具体职责为以下几项：

制定和修改项目的组织结构和配置管理策略；

批准、发布配置管理计划；

决定项目起始基线和开发里程碑；

接受并审阅配置控制委员会的报告。

的状态，测试，报告错误，并验证其修复结果；

(3) 开发人员 (Developer)：其职责就是根据组织确定的软件配置管理计划和相关规定,按照软件配置管理工具的使用模型来完成开发任务很明显,配置管理员 CMO 的权限都是√,因此⑤是可不予考虑的,测试人员是没有 ADD 权限的,项目成员是没有 CHECK 权限的,只有 CMO 才有 CHECK 权限,因此博主高度怀疑项目经理对代码的 CHECK 权限!如果项目经理对代码的 CHECK

权限是“×”,那么选项 B 是正确的。

参考答案：B

- 某项目经理在制定项目质量计划时,从客户对项目交付物的质量要求出发,先识别客户在功能方面的要求,然后把功能要求与产品的特性对应起来,形成功能要求与产品特性的关系矩阵,进而确定产品的技术参数。他采用的方法是 (63) 。

- A . 质量成本分析 B . 效益/成本分析
- C . 质量功能展开 D . 过程决策程序图法

【试题解析】

这题是送分的,项目经理采用的方法是选项“C . 质量功能展开”。

- (64) 不是进行项目质量保证采用的方法和技术。

(64) A . 制定质量保证规划

B．质量活动分解

C．建立质量保证体系

D．统计抽样 实施质量保证是审计质量要求和质量控制测量结果，确保采用合理的质量标准和操作性定义的过程。

【试题解析】

选项 A 和 C 既重复又矛盾，针对项目则需要“A．制定项目的质量保证计划”，针对一个企业则要“C．建立质量保证体系”。选项“D．统计抽样”虽然用于质量控制，但也可以用于项目质量保证过程中的抽查。因此博主的主张：“C．建立质量保证体系”不是进行项目质量保证采用的方法和技术。

第二份解释：据项目管理工程师教程可知质量保证的方法或技术有制定质量保证规划、质量活动分解、建立质量保证体系，统计抽样与质量控制有关。

参考答案：D


● 某公司对本单位负责的信息系统集成项目实施失败原因进行分析后，发现约 80%的原因都是用户需求不明确、授权不清晰、以及采用了不适宜的技术，而其他十几种原因造成的失败较少。根据这些分析结果，该公司所采用项目质量控制的方法是（65）。

A．散点图法 B．直方图法 C．帕累托法 D．控制图法

【试题解析】

该公司所采用项目质量控制的方法是“C．帕累托法”。

- 下图所表示的质量控制工具为 (66) 。

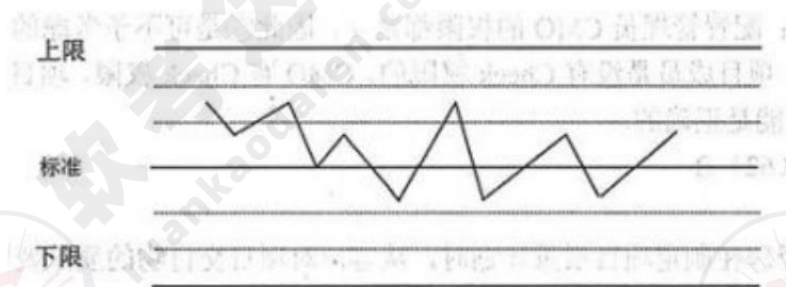

- A. 散点图法 B. 因果图 C. 帕累托图 D. 控制图

【试题解析】

很明显，该质量控制工具为“D. 控制图”。

- 有关风险识别，以下说法不正确的是 (67) 。

- A. 项目组全体成员参与风险识别
- B. 识别范围覆盖了项目的整个生命周期
- C. 风险管理计划是风险识别的输出
- D. 识别过程中综合运用了多种风险识别的技术和工具

【试题解析】

项目风险识别的特点如下：

(1)全员性:项目风险的识别是项目组全体成员参与并共同完成的任务。

(2)系统性:项目风险无处不在,无时不有,决定了风险识别的系统性,即项目寿命过程中的风险都属于风险识别的范围。

(3)动态性:风险识别并不是一次性的

(4)信息依赖性:风险识别需要做许多基础性工作,其中重要的一项工作是收集相关的项目信息。

(5)综合性:风险识别是一项综合性较强的工作,风险识别过程中要综合应用各种风险识别的技术和工具。

不正确的是选项“C.风险管理计划是风险识别的输出”

参考答案：C

● 某系统集成企业为做好项目风险管理,给风险定义了 3 个参数:

1、风险严重性:指风险对项目造成的危害程度;

2、风险可能性:指风险发生的几率;

3、风险系数:是风险严重性和风险可能性的乘积。

其中,对项目进度延误、工作量偏差的风险严重性等级和风险可行性等级如下表所示:

风险严重性等级

数	级		
风险严重性	严重	3	进度延误大于 20%，或者工作量偏差大于 30%。
	一般	2	进度延误大于 10%，或者工作量偏差大于 20%。
	轻微	1	进度延误低于 5%，或者工作量偏差低于 10%。

风险可能性等级

数	级		
风险可能性	高	3	风险发生的几率为 0.7 ~ 1.0（不包括 1.0）
	中	2	风险发生的几率为 0.3 ~ 0.7
	低	1	风险发生的几率为 0 ~ 0.3

假定该企业将风险系数大于等于 6 的情况定义为红灯状态，需要优先处理，则下列 ____ (68)

况属于红灯状态。

- (68) A . 进度延误 15%，工作量偏差 15%，发生几率为 0.5
- B . 进度延误 15%，工作量偏差 35%，发生几率为 0.2
- C . 进度延误 25%，工作量偏差 15%，发生几率为 0.4
- D . 进度延误 15%，工作量偏差 25%，发生几率为 0.4

【试题分析】

风险值等于概率影响因子。

参考答案：C


- 风险紧迫性评估多用于 ____ (69) ____ 中。

(69) A . 风险识别 B . 定性风险分析 C . 定量风险分析 D . 风险应对

【试题解析】

风险紧迫性评估多用于“B. 定性风险分析”中。

- 决策树分析是风险分析过程中的一项常用技术。某企业在项目风险分析过程中，采用了决策树分析方法，并计算出了 EMV（期望货币值）。

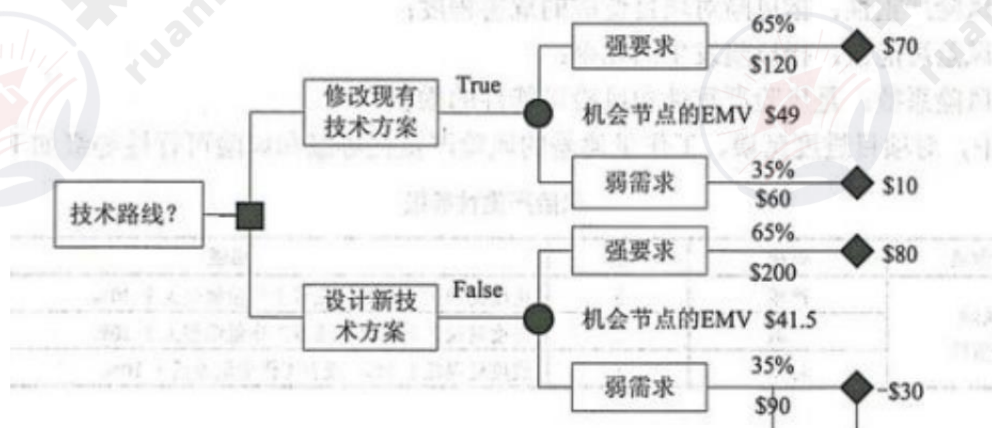

以下说法中，正确的是 (70) 。

- (70) A. 以上进行的是定量风险分析，根据分析结果应选择修改现有技术方案的路线
- B. 以上进行的是定量风险分析，根据分析结果应选择设计新技术方案的路线
- C. 以上进行的是定性风险分析，根据分析结果应选择修改现有技术方案的路线
- D. 以上进行的是定性风险分析，根据分析结果应选择设计新技术方案的路线

【试题解析】

定量风险分析是指对定性风险分析过程中识别出的对项目需求存在潜在重大影响而排序在先的风险进行的量化分析，并就风险配置一个数值。风险定量分析是在不确定情况下进行决策的一种全化的办法。该项过程采用蒙特卡洛模拟与决策树分析等项技术，以便

(1)对项目结果以及实现项目结果的概率进行量化。

(2)评估实现具体项目目标的概率。

(3)通过量化各项风险对项目总体风险的影响，确定需特别重视的风险。

(4)在考虑项目风险的情况下，确定可以实现的切合实际的成本、进度或范围目标。

(5)在某些条件或结果不确定时，确定最佳的项目管理决策。

参考答案：A

• TCP/IP communication protocol contains four layers. From bottom to top, the four layers are (71) .

(71) A . network interface layer, internet layer, transport layer and application layer

B . internet layer, network interface layer, transport layer and application layer

C . network interface layer, transport layer, network interface layer and application layer

D . application layer, transport layer, internet layer and network interface layer

【试题解析】

TCP/IP 通信协议分为四层，自下到上是

_____ A.网络接口层—互联网层—传输层—应用层

_____ B.互联网层—网络接口层-传输层-应用层

_____ C.接口层—传输层—互联网层—应用层

_____ D.应用层—传输层—互联网层—网络接口层

参考答案：A

- Ethernet is the commonly used local area network communication protocol. The standard of Ethernet is (72) .

A . IEEE 802.1 B . IEEE 802.2 C . IEEE 802.3 D . IEEE 802.11

【试题解析】

以太网的标准为 IEEE 802.3.

参考答案：C

- 73 are the four major activities of software configuration management.

①configuration identification ②statement report ③change control

④preparation of requirement document ⑤configuration auditing

①②③④ B、①②④⑤ C、①②③⑤ D、②③④⑤

【试题分析】

软件配置管理主要包括四个主要活动，①配置识别②状态报告③变更控制④准备需求

文档⑤配置审计。

参考答案：C

• The earned value technique is a commonly used method of performance measurement. It integrates project scope, cost, and schedule measures to help the project management team assess project performance. If a project' s Schedule Performance Index($SPI=EV/PV$) value less than 1.0, it means that (74) .

A . the project is ahead of its planned schedule

B . less work was completed than was planned

C . the cost overrun for work completed

D . the cost under-run of performance to date

【试题分析】

挣值分析技术是一种综合了范围、成本、进度指标的绩效测量方法，帮助项目团队评

价项目绩效。如果一个项目的进度绩效指数 SPI 值小于 1,意味着:

(74) A.项目滞后 B.项目超前 C.项目超支 D.成本有结余

参考答案:(74) B

- SWOT analysis is a kind of risk identification method. If the project team chose the SO strategy, they should (75) .

(75) A . make full use of the advantage and catch the opportunity

B . overcome the weakness and catch the opportunity

C . make full use of the advantage and reduce the threat

D . overcome the weakness and reduce the threat

【试题分析】

SWOT 分析是一种风险识别技术。如果组织团队选择 SO 战略，意味着 75 。

A.发挥优势抓住机会 B.克服弱点捉住机会

C.发挥优势减少威胁 D.克服困难较少威胁

参考答案:(75)A

想过

系统集成项目管理工程师考试真题

2011年上半年下午题（带答案）

练好真题，快速掌握，详细解析！

- ★ 本资料有：《每天一小时，两月拿证》助理整理。
- ★ 资料来自网络，无版权，无销售。供复习试用。
- ★ 欢迎大学多多指点和反馈错误和不足。
- ★ 更多资料可到www.1634.com.cn网页上方加QQ群下载。

打开网站→



←关注微信，下载打包真题。

←推送每章习题，特色练习。

系统集成项目管理工程师考试真题

2010 年上半年下午题+解析

【试题一】(15 分)

阅读以下说明，请回答问题 1 至问题 3，将解答或相应的编号填入答题纸的对应栏内。

【说明】

M 公司承担了某大学图书馆存储及管理系统的开发任务，项目周期 4 个月。

小陈是 M 公司的员工，半年前入职。在校期间，小陈跟随导师做过两年的软件开发，具有很好的软件开发基础。领导对小陈很信任，任命小陈担任该项目的项目经理。项目立项前，小陈参与了用户前期沟通会议，并承担了需求分析工作。

会议后，相关部门按照要求整理会议所形成的决议和共识，并发给客户等待确认。

为了节约时间，小陈根据自己在沟通会议上记录的结果，当晚组织相关人员撰写了软件需求规格说明。次日便要求设计人员开始进行系统设计，并指出项目组成员必须严格按照进度计划执行，以不辜负领导的期望与嘱托。

项目进行了 2 个月后，校方主管此业务的新领导到任，并提出了新的信息化管理要求。小陈进行变更代价分析，认为成本超支严重，于是小陈准备不进行范围变更，并将

结果通知客户，引起客户不满。

项目进入测试阶段后，M 公司开展内部管理审查活动。此项目作为在建项目接受了

抽查，项目审查员给该项目提出了多个问题，范围管理方面的问题尤为突出。

【问题 1】

结合本案例，分析小陈在此项目中项目范围管理方面可能存在的不足。

【问题 2】

小陈组织人员撰写的项目 WBS 如下：



(1)请说明上述 WBS 结构是将 作为第一层进行分解的。除了上述方法还可以采用 哪些方式进行分解。

(2)从上图来看，完整的 WBS 中除了实现最终产品或服务所必须进行的技术工作外，还需要包括_____。

(3)创建 WBS 时要遵循哪些原则？供选择答案（将正确选项对应的字母填入答题

纸对应栏内)：

- A.在各层次上保持项目的完整性，避免遗漏必要的组成部分
- B. 一个工作单元可从属于某些上层单元
- C. 相同层次的工作单元可以具有不同性质
- D.工作单元应能分开不同责任者和不同工作内容
- E. 便于项目管理进行计划和控制的管理需要
- F. 最低层工作应该具有可比性，是可管理的，可定量检查的
- G.分解到统一颗粒度的工作包
- H. WBS 不包括分包出去的工作

【问题 3】

(1)请指出案例中引起范围变更的原因。

(2)一般情况下，造成项目范围变更还有哪些主要原因。

参考答案：

【问理 1】 (5 分)

- 1.没有制定项目管理计划(成范围管理计划):
- 2.没有进行项目范围定义(成软件需求规格说明书只是项目范围定义物出的一个组成部分.或没有形成项目范围说明书):

3.在与干系人形成统一意见之间，就开始设计工作(或范围没有确认):

4.项目范围是否变更，应遵循正式变更流程，不由项目经理单独决定。

5.项目范围管理过程中与干系人的沟通存在问理(或范围变更没有和客户取得统一意见)。

6.软件需求规格说明没有经过评审就付诸实行:

每条 1 分，满分 5 分。

【问题 2】

参考答案：项目的管理工作

【问题 3】

参考答案：A, D, E, F

【问题 4】

项目外部环境发生变化，例如政府政策发生变化;

项目范围计划编制有错误或遗漏；

市场上出现了或设计人员提出了新技术、新手段或新方案；

项目实施组织本身发生变化；

每个一分。

【试题二】（15 分）

阅读以下说明，请回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某大楼布线工程基本情况为：一层到四层，必须在低层完成后才能进行高层布线。

每层工作量完全相同。项目经理根据现有人员和工作任务，预计每层布线需要一天完成。

项目经理编制了该项目的进度计划，并在 3 月 18 号工作时间结束后对工作进展情况进行了评估，如下表所示：

		2011 年 3 月 17	2011 年 3 月 18	2011 年 3 月 19	2011 年 3 月 20
计划	计划进度任务	完成第一层布线	完成第二层布线	完成第三层布线	完成第四层布线
	预算（元）	10000	10000	10000	10000
实际 绩效	实际进度		完成第一层		
	实际花费（元）		8000		


【问题 1】

请计算 2011 年 3 月 18 日时对应的 PV、EV、AC、CPI 和 SPI。

【问题 2】

(1)根据当前绩效，在下图中划出 AC 和 EV 曲线。（2 分）

(2)分析当前的绩效，并指出绩效改进的具体措施。

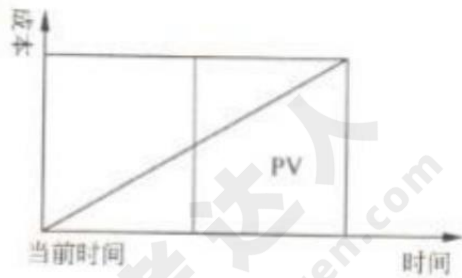

【问题 3】

(1)如果在 2011 年 3 月 18 日绩效评估后,预测此种情况下的 ETC、EAC 和完工日期。

(2)如果在 2011 年 3 月 18 日绩效评估后,目前状态开展工作,请预测此种情况下的 ETC、

【试题解析】

试题二是一道有关挣值分析计算的试鹿,题目给出了相关的条件,要求考试能够识别

出 PV, AC 和 EV。同时,根据这些参数来计算 CV 和 SV,然后来判断项目的状态。解答

此题的关键在充分理解 PV, AC 和 EV 的概念,同时,需要识记相关的公式,例如,

$$CPI = EV / AC$$

和 $SPI = EV / PV$ 。难点在于完工预测部分,计算 ETC 和 EAC。要求识别典型偏差和非典型

偏

差,对于典型偏差,要求知道公式 $EAC = AC + (BAC - EV) / CPI$ 。在典型偏差情况下,ETC-

$$(BAC - EV) / CPI。$$

参考答案:

【问题 1】(5 分)计算 2011-3-18 号相对应的 PV, EV, AC, CPI 和 SPI.


$$PV=10000+10000=20000 \text{ 元} \quad EV=10000 \text{ 元} \quad AC=8000 \text{ 元}$$

$$CPI=EV/AC=10000/8000=1.25$$

$$SPI=EV/PV=10000/20000=0.5$$

【问题 2】(4 分)

根据当前绩效在下图中划出 AC 和 EV 的曲线。

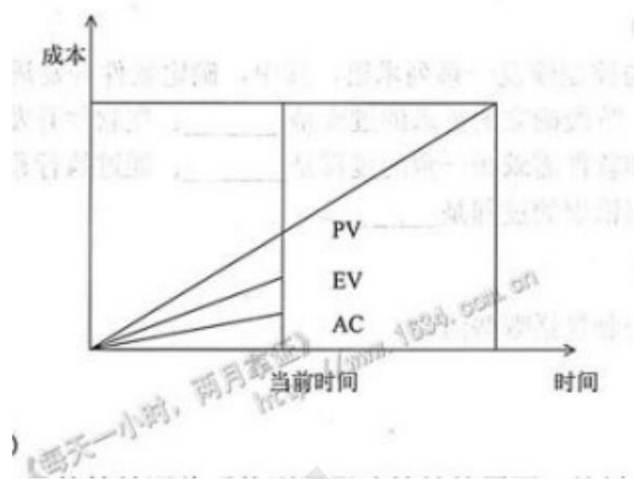

【问题 3】(6 分)

如果在 2011-3-18 日的绩效评估后找到了影响绩效的原因，并纠正了项目偏差，

请计算

ETC 和 EAC 并预测此种情况下的完工日期。

$$\text{答:ETC=EAC-EV}=40000-10000=30000 \text{ 元}$$

$$EAC=AC+ETC=8000+30000=38000 \text{ 元}$$

预测完工日期为:3 月 21 号(2 分)

如果在 2011-3-18 日的绩效评估后未能找到影响绩效的原因,请计算 ETC 和 EAC

并预

测此种情况下的完工日期。

$$ETC=(EAC-EV) / CPI- (40000-10000)/1.25=30000/1.25=24000 \text{ 元}$$

$$EAC=AC+ETC=8000+24000=32000 \text{ 元}$$

预测完工日期为:3 月 24 号(4 分)

【试题三】(15 分)

阅读以下说明,请回答问题 1 至问题 3,将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某系统集成商 A 两年前通过了 ISO9000 认证,并能够按照要求持续改进,不断

提高

质量管理水平。

近期，该公司承担了某自然灾害预警系统项目。由于项目时间紧张，上线任务迫切，

经过管理层讨论，决定临时简化流程，在开发阶段集中对质量进行把关。

由于以前做过类似的项目，为了节约时间，项目经理带领团队套用原有成功项目的

需求和设计思路，对历史上类似项目的相关文档进行修改后，立即进入编码阶段。编码完成后，为争取系统提前交付，匆忙进行测试，并上线试运行。

系统试运行中，各种错误不断涌现。到目前为止，延期半年还没有交付，严重影响了

用户满意度。

【问题 1】

结合本案例，分析该项目在质量管理方面可能存在的不足，并简述项目质量管理的流程。

【问题 2】

(1)面对该项目现状，你作为该项目的项目经理，请提出下一步的应对措施。

(2)软件的质量保证与控制涉及一系列术语，其中，确定软件开发周期中的一个给定阶段的产品是否达到在上一阶段确立的需求的过程是(A)；在软件开发过程结束

时对软件进行评价以确定它是否和软件需求相一致的过程是(B)；通过执行程序来

有意识地发现程序中的设计错误和编码错误的过程是(C)。

【问题 3】

请说明项目质量控制包括哪些活动？

参考答案：

【问题 1】（5 分）

- 1.公司未按照质量保证的标准体系进行质量管理(有法不依)
- 2.质量保证部门或人员没有对项目全过程的实施进行指导与监控(全程参与).
- 3.需求设计相关文件没有经过评审(概要设计、详细设计文件没有经过评审)。
- 4.前期测试工作不充分(有可能忽视了单元测试、代码走查、系统测试、集成测试等

环节)。(每条 1 分，满分 2 分)

质量管理流程:

- 1.确立质全标准体系。
- 2.对项目实施进行质量监控。
- 3.将实际与标准对照。
- 4.纠偏纠错。

(每条 1 分，满分 3 分)

【问题 2】：

答案：验证、确认、测试

【问题 3】

- I、保证由内部或外部机构进行检测管理的一致性;
- 2、发现与质量标准(客户需求、质量需求)的差异;
- 3、消除产品与服务过程中性能不能被满足的原因(分析原因并解决);
- 4、审查质量标准以决定可以达到的目标、成本，即效率问题;
- 5、确定是否可以修订项目的质量标准或项目的具体目标。(每条 1 分，满分 2 分)

【试题四】（15 分）

阅读以下说明，请回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

在系统集成项目收尾的时候，项目经理小张和他的团队完成了以下工作。

工作一：系统测试。项目组准备了详尽的测试用例，会同业主共同进行系统测试。

测试过程中为了节约时间，小张指派项目开发人员小李从测试用例中挑选了部分数据进行测试，保证系统正常运行。

工作二：试运行。项目组将业主的数据和设置加载到系统中进行正常操作，完成了
试运行工作。

工作三：文档移交。小张准备了项目最终报告、项目介绍、说明手册、维护手册、
软硬件说明书、质量保证书等文档资料发送给业主。

工作四：项目验收。经过业主验收后，小张派小李撰写了项目验收报告，并提请
双方工作主管认可。

工作五：准备总结会。小张整理了项目过程文档以及项目组各技术人员的经验，
并列出了项目执行过程中的若干优点。

工作六：召开总结会。小张召集全体参与项目的人员参加了总结会，并就相关内
容进行了讨论，形成了总结报告。

【问题 1】

请指出案例中的六项工作中哪些工作存在问题并具体说明。

【问题 2】

工作六中，项目组召开了总结会，那么总结会讨论的内容可以包含_____、

【问题 3】

项目总结会召开之前，核心技术人员小王产生了抵触心理，他认为更多的时间应该放在技术研发上而不是浪费时间召开会议。请简要阐述项目经理小张应该如何从召开总结会意义的角度说服小王参加项目总结会。

【试题分析】

试题四考查项目质量管理方面的知识点。

与试题一“师出同门”，考核方法类似，老套路“找问题，解决问题！”，然后再考核考

生的记忆能力，比如质量管理的流程、质量控制的方法等。

参考答案:

1、工作一:项目开发人员不能参与系统测试,测试用例中除了挑选合理有效的数据

应包括不合理无效的数据。工作三:文档移交时应先验收合格并经双方签字认可。工作四:

应该是由双方共同撰写报告而不是承建方单独撰写。工作五:经验总结中不仅要列出优点还应列出若干缺点。

2、工作六中项目组召开了总结会议，总结的内容应包括项目绩效、技术绩效、成本

绩

效、进度计划绩效、项目的沟通，识别问题和解决问题、意见和建议。

3、.可以从以下四个方面去说服小王参加项目总结会:(1)了解项目全过程的工作情况
及相关的团队或成员的绩效状况，(2)了解出现的问题并进行改进措施总结；(3)了解
项目全过程中出现的值吸取的经验并进行总结;(4)对总结后的文档进行讨论,通过后即存
入公司的知识库,从而纳入企业的过程资产。

【试题五】（15 分）

阅读以下说明，请回答问题 1 至问题 4，将解答或相应的编号填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某系统集成企业最近与某法院信息中心签订了一个法院综合信息系统运维项目合
同，并签订了服务级别协议，对服务内容和具体要求进行了约定。协议中要求运维项目
从解决问题过程到控制问题过程及发布过程要与法院服务管理流程很好的衔接，并建立
服务台。而法院信息中心对系统的运维管理非常重视，于 2010 年 10 月通过了
ISO20000
的认证。

该系统集成企业的小张被任命为该运维项目的项目经理。小张如何运用学到的项目

管理和 IT 服务管理方面的知识做好流程梳理和队伍建设对管理好该项目至关重要。

【问题 1】

结合本案例，判断下列选项的正误（填写在答题纸的对应栏内，正确的选项填写

“√” ，

错误的选项填写 “×” ）

- (1) GB/T24405.1-2009 与 ISO20000.1-2005 内容是一致的。
- (2)该运维合同与服务级别协议没有关系。
- (3)服务级别协议中的服务响应时间是决定服务收费的依据之一。
- (4)运维服务中配置管理完全是系统集成企业的责任。
- (5)服务台就是热线电话。

【问题 2】

按照 IT 服务管理规范，请指出控制过程和发布过程包含哪些内容。

【问题 3】

小张在流程梳理的前期调研时，发现某员工电脑不能发送邮件。该问题的实际处

置

过程往往要经过：问题提出→服务台记录问题→工程师调查问题→解决问题→如果该现

象经常出现要调查原因→批准和更新设施或软件。按照 IT 服务管理规范，请选择恰当

选

项按照顺序填入空白处，构成 IT 服务管理流程。

(1)服务台 (2)____(3)____(4)____(5) 备选项：

A.事件管理 B.能力管理 C.问题管理 D.服务报告 E.发布管理

【问题 4】（4 分）

请简述 IT 服务管理的业务价值。

参考答案：

【问题 1】（5 分）

(1) √ ; (2) X; (3) √ ; (4) X ; (5) X

【问题 2】（3 分）

(1)控制过程组:包括配置管理、变更管理。

(2)发布过程组:包括发布管理。

【问题 3】（3 分）

(2)、C (3)、C (4)、E

【问题 4】（4 分）

确保 IT 流程支撑业务流程，整体上提高了业务运营的质量：

通过事故管理流程、变更管理流程和服务台等提供了更可靠的业务支持；

客户对 IT 有更合理的期望，并更加清楚为达到这些期望他们所需要的付出：

提高了客户和业务人员的生产率：

提供更加及时有效的业务持续性服务：

客户和 IT 服务提供者之间建立更加融洽的工作关系：

提高了客户满意度。
