

【软考达人】

软考资料免费获取

- 1、最新软考题库
- 2、软考备考资料
- 3、考前压轴题



微信扫一扫，立马获取



6W+ 免费题库



免费备考资料

PC版题库: ruankaodaren.com

2017 年下半年系统集成项目管理工程师真题

(上午参考答案)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	C	C	A	C	D	B	B	D	C	D
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	A	C	B	B	B	B	A	C	C	A
题号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
答案	C	D	B	C	B	B	C	C	A	D
题号	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
答案	D	A	C	B	C	D	D	B	A	B
题号	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
答案	C	C	D	B	D	C	D	A	D	A
题号	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
答案	B	D	B	D	A	B	D	C	D	D
题号	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
答案	A	B	D	A	C	B	B	A	A	C
题号	71	72	73	74	75					
答案	A	B	C	B	D					

第 1 题 以下关于信息的表述，不正确的是：___

- A、信息是对客观世界中各种事物的运动状态和变化的反映
- B、信息是事物的运动状态和状态变化方式的自我表述
- C、信息是事物普遍的联系形式，具有不确定性、不可量化等特点
- D、信息是主体对于事物的运动状态以及状态变化方式的具体描述

【答案】C

【解析】答案 C 前半句“信息是事物普遍的联系形式”是对的，但后半句“具有不确定性、不可量化等特点”不确的，按香农认为：信息就是能够用来消除不确定性的东西，信息还可以理解为消除不确定性的一种度量。中级教材第二版 P1：信息是客观事物状态和运动特征的一种普遍形式，客观世界中大量地存在、产生和传递着以这些方式表示出来的各种各样的信息。A 正确。

中级教材第二版 P2：事物的本体论信息，就是事物的运动状态和状态变化方式的自我表述，B 正确

中级教材第二版 P2：主体关于某个事物的认识论信息，就是主体对于该事物的运动状态以及状态变化方式的具体描述。D 正确

第 2 题 信息化建设是我国现代化建设的重要组成部分，信息化的手段是：___

- A、创建信息时代的社会生产力，推动社会生产关系及社会上层建筑改革
- B、使国家的综合实力、社会文明素质和人民的生活质量全面提升
- C、基于现代信息技术的先进社会生产工具
- D、全体社会成员，包括政府、企业、事业、团体和个人的共同努力

【答案】C

【解析】中级教材第二版 P8：信息化的基本内涵启示我们：信息化的主体是全体社会成员，包括政府、企业、事业、团体和个人；它的时域是一个长期的过程；它的空域是政治、经济、文化、军事和社会的一切领域；它的手段是基于现代信息技术的先进社会生产工具；它的途径是创建信息时代的社会生产力，推动社会生产关

系及社会上层建筑的改革;它的目标是使国家的综合实力、社会的文明素质和人民的生活质量全面提升。

第3题 国家信息化体系要素中, ____是国家信息化的主阵地, 集中体现了国家信息化建设的需求和效益。

- A、信息技术应用 B、信息网络 C、信息资源 D、信息化人才

【答案】A

【解析】中级教材第二版 P8-9:信息技术应用是指把信息技术广泛应用于经济和社会各个领域。信息技术应用是信息化体系6要素中的龙头, 是国家信息化建设的主阵地

第4题 2017年7月8日,《国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知》中涉及了人工智能的几个基础理论, 其中, ____研究统计学习基础理论、不确定性推理与决策、分布式学习与交互、隐私保护学习等学习理论和高效模型。

- A、大数据智能理论 B、跨媒体感知计算理论
C、高级机器学习理论 D、群体智能理论

【答案】C

【解析】参见《国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知

1. 大数据智能理论。研究数据驱动与知识引导相结合的人工智能新方法、以自然语言理解和图像图形为核心的认知计算理论和方法、综合深度推理与创意人工智能理论与方法、非完全信息下智能决策基础理论与框架、数据驱动的通用人工智能数学模型与理论等
2. 跨媒体感知计算理论。研究超越人类视觉能力的感知获取、面向真实世界的主动视觉感知及计算、自然声学场景的听知觉感知及计算、自然交互环境的言语感知及计算、面向异步序列的类人感知及计算、面向媒体智能感知的自主学习、城市全维度智能感知推理引擎
3. 混合增强智能理论。研究“人在回路”的混合增强智能、人机智能共生的行为增强与脑机协同、机器直觉推理与因果模型、联想记忆模型与知识演化方法、复杂数据和任务的混合增强智能学习方法、云机器人协同计算方法、真实世界环境下的情境理解及人机群组协同。
4. 群体智能理论。研究群体智能结构理论与组织方法、群体智能激励机制与涌现机理、群体智能学习理论与方法、群体智能通用计算范式与模型。
5. 自主协同控制与优化决策理论。研究面向自主无人系统的协同感知与交互, 面向自主无人系统的协同控制与优化决策, 知识驱动的人机物三元协同与互操作等理论
6. 高级机器学习理论。研究统计学习基础理论、不确定性推理与决策、分布式学习与交互、隐私保护学习、小样本学习、深度强化学习、无监督学习、半监督学习、主动学习等学习理论和高效模型
7. 类脑智能计算理论。研究类脑感知、类脑学习、类脑记忆机制与计算融合、类脑复杂系统、类脑控制等理论与方法。

8. 量子智能计算理论。探索脑认知的量子模式与内在机制, 研究高效的量子智能模型和算法、高性能高比特的量子人工智能处理器、可与外界环境交互信息的实时量子人工智能系统等

第5题 电子政务的内容非常广泛, 我们常见的中国政府采购网属于 ____

- A、G2G B、G2C C、G2E D、G2B

【答案】D

【解析】中国政府采购网主要是政府对企业的电子政务, 所以是 G2B

第6题 ____通过互联网进行商品销售、提供服务, 是以信息技术为手段的商务活动。

- A、电子政务 B、电子商务 C、电视购物 D、电话购物

【答案】B

【解析】四个选项里只有电子商务是最合适的, 送分题。

第7题 《中国制造2025》提出“推进信息化与工业化深度融合”的重点任务, 加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展, 把 ____作为两化深度融合的主攻方向。

- A、人工智能 B、智能制造 C、大数据 D、云计算

【答案】B

【解析】中级教材第二版 P41: 加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展, 把智能制造作为两化深度融合的主攻方向; 着力发展智能装备和智能产品, 推进生产过程智能化, 培育新型生产方式, 全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。

第 8 题 以下____不属于商业智能系统应具有的主要功能。

- A、数据仓库 B、分析功能 C、数据 ETL D、企业战略决策

【答案】D

【解析】商业智能系统应具有的主要功能不包括 D。中级教材第二版 P78 商业智能系统应具有的主要功能

(1) 数据仓库: 高效的数据存储和访问方式。提供结构化和非结构化的数据存储, 容量大, 运行稳定, 维护成本低, 支持元数据管理, 支持多种结构, 例如中心式数据仓库和分布式数据仓库等存储介质能够支持近线式和二级存储器, 能够很好地支持容灾和备份方案。

(2) 数据 ETL: 数据 ETL 支持多平台、多数据存储格式(多数据源、多格式数据文件、多维数据库等)的数据组织, 要求能自动地根据描述或者规则进行数据查找和理解。减少海量、复杂数据与全局决策数据之间的差距。帮助形成支撑决策要求的参考内容

(3) 数据统计输出(报表): 报表能快速地完成数据统计的设计和展示, 其中包括了统计数据表样式和统计图展示, 可以很好地输出给其他应用程序或者以 Html 形式表现和保存。对于自定义设计部分要提供简单易用的设计方案, 支持灵活的数据填报和针对非技术人员设计的解决方案。能自动地完成输出内容的发布。

(4) 分析功能: 可以通过业务规则形成分析内容, 并且展示样式丰富, 具有一定的交互要求, 例如预警或者趋势分析等。要支持多维度的 OLAP 实现维度变化、旋转、数据切片和数据钻取等, 以帮助做出正确的判断和决策

第 9 题 智能挖掘分析是智慧城市建设参考模型____中的关键技术。

- A、智慧应用层 B、计算与存储层
C、数据及服务支撑层 D、网络通信层

【答案】C

【解析】参见中级教材第二版 P100, 图 1-24。数据及服务支撑层包括业务通用服务、SOA、海量数据汇聚与存储、数据融合与处理、智能挖掘分析、协同处理。

第 10 题 信息技术服务标准(ITSS)规定了 IT 服务的组成要素和生命周期, IT 服务生命周期有规划设计、部署实施、服务运营、持续改进、____五个阶段组成。

- A、二次规划设计 B、客户满意度调查
C、项目验收 D、监督管理

【答案】D

【解析】参见中级教材第二版 P122: IT 服务生命周期由规划设计(Planning& Design)、部署实施(Implementing)、服务运营(Operation)、持续改进(Improvement)和监督管理(Supervision)5 个阶段组成, 简称 PI OIS

第 11 题 ____不属于信息系统审计的主要内容。

- A、信息化战略 B、资产的保护
C、灾难恢复与业务持续计划 D、信息系统的管理、规划与组织

【答案】A

【解析】参见中级教材第二版 P129-130: 一个信息系统审计的主要组成部分包括以下 6 个方面。

(1) 信息系统的管理、规划与组织: 评价信息系统的管理、计划与组织方面的策略、政策、标准、程序和 related 实务。

(2) 信息系统技术基础设施与操作实务: 评价组织在技术与操作基础设施的管理和实施方面的有效性及效率, 以确保其充分支持组织的商业目标。

(3) 资产的保护: 对逻辑、环境与信息技术基础设施的安全性进行评价, 确保其能支持组织保护信息资产的需要, 防止信息资产在未经授权的情况下被使用、披露、修改、损坏或丢失。

(4) 灾难恢复与业务持续计划:这些计划是在发生灾难时,能够使组织持续进行业务,对这种计划的建立和维护流程需要进行评价。

(5) 应用系统开发、获得、实施与维护:对应用系统的开发、获得、实施与维护方面所采用的方法和流程进行评价,以确保其满足组织的业务目标

(6) 业务流程评价与风险管理:评估业务系统与处理流程,确保根据组织的业务目标对相应风险实施管理
不包括答案 A

第 12 题 某公司准备将运行在本地局域网上 CRM 系统迁移到集团云平台上并做适当的功能扩展,从信息系统生命周期的角度看,该 CRM 系统处于____阶段。

A、立项 B、开发 C、运维 D、消亡

【答案】C

【解析】这个是典型的运维阶段,因为有了系统,做迁移和功能扩展,算是适应性维护等。

第 13 题 信息系统设计是开发阶段的重要内容,主要任务包括____

- ①明确组织对信息系统的实际需求,制定系统架构
- ②对系统进行经济、技术事件、运行环境和用户使用等方面的可行性研究
- ③选择计算机、操作系统、数据库、网络及技术等方案
- ④确定软件系统的模块结构

A、②③④ B、①②③ C、①②④ D、①③④

【答案】D

【解析】参见中级教材第二版 P134:信息系统设计是开发阶段的重要内容,其主要任务是从信息系统的总体目标出发,根据系统逻辑功能的要求,并结合经济、技术条件、运行环境和进度等要求,确定系统的总体架构和系统各组成部分的技术方案,合理选择计算机、通信及存储的软、硬件设备,制订系统的实施计划

这题②是比较好排除的,因为是明显的可研内容,②排除后就只有答案 D 了

第 14 题 需求分析是软件生存周期中的重要工作,以下描述不正确的是____

- A、软件需求是针对待解决问题的特征描述
- B、绝大部分软件需求可以被验证,验证手段包括评审和测试
- C、需求分析可以检测 and 解决需求之间的冲突
- D、在资源有限时,可以通过优先级对需求进行权衡

【答案】B

【解析】B 是错误的,不是绝大部分,是所有需求都必须是可以验证的。

参见中级教材第二版 P135:软件需求是针对待解决问题的特性的描述。所定义的需求必须可以被验证。在资源有限时,可以通过优先级对需求进行权衡。

通过需求分析,可以检测和解决需求之间的冲突,发现系统的边界;并详细描述出系统需求

第 15 题 封装、继承和多态是面向对象编程的三大特征,再 Java 开发过程中有着广泛应用,以下关于它们的描述不正确的是____

- A、封装是将数据和基于数据的操作封装成一个整体对象,通过接口实现对数据的访问和修改
- B、继承关系中中共有的类属性特征均需在父类和子类中进行说明
- C、多态使得一个类实例的相同方法在不同情形有不同表现形式
- D、多态机制使具有不同内部结构的对象可以共享相同的外部接口

【答案】B

【解析】参见中级教材第二版 P138:封装:将相关的概念组成一个单元模块,并通过一个名称来引用它。面向对象封装是将数据和基于数据的操作封装成一个整体对象,对数据的访问或修改只能通过对象对外提供的接口进行。答案 A 正确

B 答案是错误的,子类从父类继承的属性特征,不用重复说明。参见 P139 说明:Dog 和 Cat 类都是从 Mammal 继承而来,具有父类的 eyeColor 属性特征,因此在子类中就可以不用重复指定 eye Color 这个属性

参见中级教材第二版 P139:多态使得在多个类中可以定义同一个操作或属性名,并在每个类中可以有不同的实现。多态使得某个属性或操作在不同的时期可以表示不同类的对象特性。C 和 D 是正确的说法

第 16 题 某企业的 ERP 系统已经稳定运行了 3 年,为了使用新业务发展的需要,运营团队近期接到数据库系统升级服务的任务,它属于信息系统____类型的工作。

- A、更正性维护 B、适应性维护 C、完善性维护 D、预防性维护

【答案】B

【解析】软件维护有如下类型:①更正性维护——更正交付后发现的错误;②适应性维护——使软件产品能够在变化后或变化中的环境中继续使用;③完善性维护——改进交付后产品的性能和可维护性;④预防性维护——在软件产品中的潜在错误成为实际错误前,检测并更正它们
数据库升级、迁移等都算是适应性维护。

第 17 题 ____是一种软件技术,在数据仓库中有广泛的应用,通过访问大量的数据实现数据处理分析要求,实现方式是从数据仓库中抽取详细数据的一个子集并经过必要的聚焦存储到该服务器中供前端分析工具读取。

- A、联机分析处理 (OLAP) B、联机事务处理 (OLTP)
C、数据采集工具 (ETL) D、商业智能分析 (BI)

【答案】A

【解析】数据仓库系统的结构包括数据源、数据的存储与管理、OLAP 服务器、前端工具。其中 OLAP 服务器对分析需要的数据进行有效集成,按多维模型予以组织,以便进行多角度、多层次的分析

本题只有 A 答案最合适。

第 18 题 在 OSI 七层协议中,____充当了翻译官的角色,确保一个数据对象在网络中的计算机以双方协商的格式进行准确的数据转换和解密。

- A、应用层 B、网络层 C、表示层 D、会话层

【答案】C

【解析】参见中级教材第二版 P18:表示层:如同应用程序和网络之间的翻译官,在表示层,数据将按照网络能理解的方案进行格式化;这种格式化也因所使用网络的类型不同而不同。表示层管理数据的解密加密、数据转换、格式化和文本压缩,常见的协议有 JPEG、ASCII GIF、DES、MPEG。

第 19 题 在下列传输介质中,____的传输速率最高。

- A、双绞线 B、统筹电缆 C、光纤 D、无线介质

【答案】C

【解析】光纤的传输速率最高。常识送分题。

第 20 题 某公司承接了某政府机关的办公网络改造项目,在进行网络总体设计的考虑使用汇聚交换机,从基础层面考虑,最直接的原因是____

- A、办公楼内的信息点较多,使用 3 台交换机采用极联方式罗冲端口
B、两栋办公楼距离较远,使用了百兆光纤电缆
C、网络用户数量超过 10000 人
D、本项目采用了星型网络拓扑结构

【答案】A

【解析】参见中级教材第二版 P157:汇聚层的存在与否,取决于网络规模的大小。当建筑楼内信息点较多(比如大于 22 个点)超出一台交换机的端口密度,而不得不增加交换机扩充端口时,就需要有汇聚交换机。

第 21 题 关于 WLAN 描述不正确的是____

- A、802.11n 是 IEEE 制定的一个无线局域网标准协议
B、无线网络与有线网络的用途类似,最大的不同在于传输媒介的不同
C、无线网络技术中不包括为近距离无线连接进行优化的红外线技术
D、现在主流应用的是第四代无线通信技术

【答案】C

【解析】参见中级教材第二版 P155: 无线网络既包括允许用户建立远距离无线连接的全球语音和数据网络, 也包括为近距离无线连接进行优化的红外线技术及射频技术, 与有线网络的用途十分类似, 最大的不同在于传输媒介的不同, 利用无线电技术取代网线, 可以和有线网络互为备份

第 22 题 《中华人民共和国网络安全法》与 2017 年 6 月 1 日起开始实施, ____负责统筹协调网络安全工作和相关监督管理工作。

- A、国务院电信主管部门 B、工业和信息化部主管部门
C、公安部门 D、国家网信部门

【答案】D

【解析】《中华人民共和国网络安全法》: 第八条国家网信部门负责统筹协调网络安全工作和相关监督管理工作。国务院电信主管部门、公安部门和其他有关机关依照本法和有关法律、行政法规的规定, 在各自职责范围内负责网络安全保护和监督管理工作

第 23 题 在将数据源经过分析挖掘到最终获得价值的大数据处理过程中, MapReduce 是在____阶段应用分布式并处理关键技术的常用工具。

- A、数据采集 B、数据管理 C、数据存储 D、数据分析与挖掘

【答案】B

【解析】参见中级教材第二版 P 172: 大数据所涉及的技术很多, 主要包括数据采集、数据存储、数据管理、数据分析与挖掘四个环节

1 在数据采集阶段主要使用的技术是数据抽取工具 ETL。

2 在数据存储环节主要有结构化数据、非结构化数据和半结构化数据的存储与访问。结构化数据般存放在关系数据库, 通过数据查询语言 (SQL) 来访问; 非结构化 (如图片、视频、doc 文件等) 和半结构化数据一般通过分布式文件系统的 NOSQL (Not Only SQL) 进行存储, 比较典型的 NoSQL 有 Google 的 Bigtable、Amazon 的 Dynamo 和 Apache 的 Hbase

3 大数据管理主要使用了分布式并行处理技术, 比较常用的有 MapReduce, 编程人员借助 MapReduce 可以在不会分布式并行编程的情况下, 将自己的程序运行在分布式系统上。数据分析与挖掘是根据业务需求对大数据进行关联、聚类、分类等钻取和分析, 并利用图形、表格加以展示, 与 EIL 一样, 数据分析和挖掘是以前数据仓库的范畴, 只是在大数据中得以更好的利用。

第 24 题 某公司已建企业云, 近期遇到了网站服务器因宽带限制而突然崩溃的情况, 为了避免以上问题, 该公司从某云服务供应商处购买了云服务, 经过重新部署可以解决其网站使用量突然猛增的情况, 这种部署方式通常称为____模式。

- A、私有云 B、公有云 C、混合云 D、社区云

【答案】C

【解析】参见中级教材第二版 P163: 从应用范围来看, 云计算又可分为公有云、私有云和混合云公有云通常指第三方提供商用户能够使用的云, 公有云一般可通过 Internet 使用, 可能是免费或成本低廉的。

私有云是为一个客户单独使用而构建的, 因而提供对数据、安全性和服务质量的最有效控制。该公司拥有基础设施, 并可以控制在此基础设施上部署应用程序的方式

混合云就是将公有、私有两种模式结合起来, 根据需要提供统一服务的模式此题是企业私有云和公有云的混合使用

第 25 题 以下对物联网的描述不正确的是____

- A、物联网即“物物相连之网”
B、物联网是一种物理上独立存在的完整网络
C、物联网的“网”应和通讯介质、通信拓扑结构无关
D、物联网从架构上可以分为感知层、网络层和应用层

【答案】B

【解析】参见中级教材第二版 P163:物联网不是一种物理上独立存在的完整网络,而是架构在现有互联网或下一代公网或专网基础上的联网应用和通信能力,是具有整合感知识别、传输互联和计算处理等能力的智能型应用。

第 26 题 移动互联网是一种通过智能移动终端,采用移动无线通信方式获取业务和服务的新兴业务,其主流操作系统开发平台不包括___

- A、Android B、unix C、ISO D、Windows phone

【答案】B

【解析】unix 是 PC 上的操作系统平台。

第 27 题

2015 年 5 月 19 日,国务院印发《中国制造 2025》,明确指出将以信息化与工业化深度融合为主线,重点发展十大领域,其中“新一代信息通信技术产业”主要聚焦在___类别的产品上。

- ①集成电路及专用装备 ②信息通信设备 ③先进轨道交通设备 ④操作系统及工业软件

- A、①②③ B、②③④ C、①②④ D、①③④

【答案】C

【解析】参见《中国制造 2025》的(六)大力推动重点领域突破发展——1. 新一代信息技术产业:集成电路及专用装备、信息通信设备、操作系统及工业软件,不包括③先进轨道交通设备。

http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/19/content_9784.htm


第 28 题 以下关于项目与项目管理的描述不正确的是___

- A、项目临时性是指每一个项目都有一个明确的开始时间和结束时间
B、渐进明细是指项目的成果性目标是逐步完成的
C、项目的目标不存在优先级、项目目标具有层次性
D、项目整体管理属于项目管理核心知识域

【答案】C

【解析】参见中级教材第二版 P177:项目的目标有不同的优先级

第 29 题 下图中的项目组织结构属于___

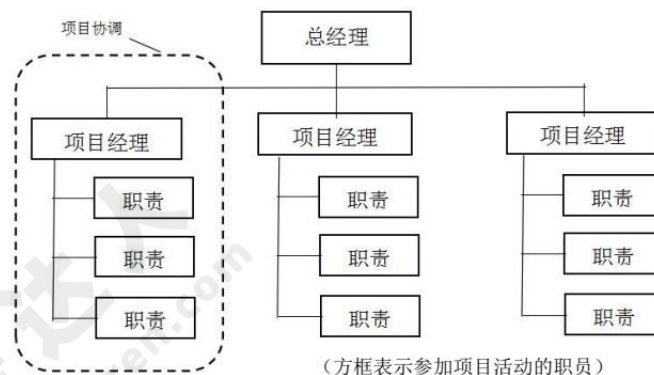

- A、项目型组织 B、职能型组织 C、弱矩阵型组织 D、强矩阵型组织

【答案】A

【解析】这个是典型的项目型组织,见课件说明或中级教材第二版 P196 图 4-4

第 30 题 某公司承接一个互联网企业的开发项目,由于互联网业务变化较快,无法再项目初期准确确定出项目需求,你作为项目经理应首先考虑的开发模型是___

- A、瀑布模型 B、V 模型 C、螺旋模型 D、原型化模型

【答案】D

【解析】中级教材第二版 P210:原型化模型减少了瀑布模型中因为软件需求不明确而给开发工作带来的风险,

因为在原型基础上的沟通更为直观,也为需求分析和定义,提供了新的方法。从四个答案看,只有D最合适。

第31题 以下关于项目管理过程组的描述不正确的是_____

- A、所有项目都必须经理5个过程组
- B、每个单独的过程都明确了如何使用输入来产生项目过程组的输出
- C、制定项目管理计划所需要的过程都属于计划过程组
- D、控制变更,推荐纠正措施属于执行过程组

【答案】D

【解析】控制变更,推荐纠正措施属于监控过程组,答案D是明显的错误。

第32题 以下关于项目建议书的叙述中,不正确的是_____

- A、项目建议书一般由项目承建单位编写,提交项目建设单位审批
- B、项目建议书是选择项目的依据,也是可行性研究的依据
- C、项目建议书包括项目建设的必要性,业务分析,总体建设方案,实施进度,效益与风险分析等内容
- D、某些情况下,项目建议书的编写,申报和审批工作可与项目可行性分析阶段的工作合并

【答案】A

【解析】中级教材第二版P22:项目建议书是项目建设单位向上级主管部门提交的项目申请文件,是对拟建项目提出的总体设想。A是错误的。

P22:项目建议书是项目发展周期的初始阶段,是国家或上级主管部门选择项目的依据,也是可行性研究的依据。B正确。

P223:项目建议书主要内容:项目简介、项目建设单位概况、项目建设的必要性、业务分析、总体建设方案、本期项目建设方案、环保消防职业安全、项目实施进度、投资估算和资金筹措、效益与风险分析。C正确。

P224:项目建设单位可以规定对于规模较小的系统集成项目省略项目建议书环节,而将其与项目可行性分析阶段进行合并。D正确。

第33题 在项目可行性研究内容中,_____包括制定合理的项目实施进度计划,设计合理的组织结构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等内容。

- A、技术可行性
- B、财务可行性
- C、组织可行性
- D、流程可行性

【答案】C

【解析】中级教材第二版P225:4.组织可行性

制定合理的项目实施进度计划、设计合理的组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等,保证项目顺利执行

第34题 以下关于项目可行性研究的叙述中,不正确的是_____

- A、机会可行性研究的目的是激发投资者的兴趣,寻找投资机会
- B、在项目立项阶段,即使是小型项目,详细可行性研究也是必须的
- C、详细可行性研究是一项费时,费力且需一定资金支持的工作
- D、项目可行性研究报告一般委托具有相关专业资质的工程咨询机构编制

【答案】B

|| 载入图片

【解析】B是错误答案。详细可研不是必须的,实际中很多小项目都不做可研。

中级教材第二版P227:机会可行性研究的主要任务是对投资项目或投资方向提出建议,并对各种设想的项目和投资机会做出鉴定,其目的是激发投资者的兴趣,寻找最佳的投资机会。A正确

中级教材第二版P228:详细可行性研究需要对一个项目的技术、经济、环境及社会影响等进行深入调查研究,是一项费时、费力且需一定资金支持的工作,特别是大型的或比较复杂的项目更是如此C正确

中级教材第二版P228:项目通过项目建议书批准环节后,项目建设单位应依据项目建议书批复意见,通过招标选定或委托具有相关专业资质的工程咨询机构编制项目可行性研究报告,报送项目审批部门。D正确。

第35题 以下关于项目招投标的叙述中,正确的是_____

- A、资格预审文件或招投标文件的发售期不得少于 15 日
- B、投标保证金不得超过招标项目估算价的 5%
- C、评估委员会的人员数量不得少于 5 人
- D、书面合同具备法律效力，中标通知书不具有法律效力

【答案】C

【解析】中级教材第二版 P229: 资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于 5 日, A 错误中级教材第二版 P230: 招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的, 投标保证金不得超过招标项目估算价的 2% 投标保证金有效期应当与投标有效期一致。B 错误。

中级教材第二版 P234: 评标委员会由具有高级职称或同等专业水平的技术、经济等相关领域专家、招标人和招标机构代表等 5 人以上单数组成, 其中技术、经济等方面专家人数不得少于成员总数的 2/3。所以 C 是正确的

中级教材第二版 P235: 中标人确定后, 招标人应当向中标人发出中标通知书, 并同时 will 将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。D 错误。

第 36 题 当与客户签署合同之后, 许多供应商会进行内部立项, 内部立项的主要作用不包括____

- A、通过内部立项方式为项目分配资源
- B、通过内部立项方式确定合理的项目绩效目标
- C、通过内部立项方式提升项目实施效率
- D、通过内部立项方式降低成本

【答案】D

【解析】中级教材第二版 P237: 项目内部立项主要有几方面原因

第一, 通过项目立项方式为项目分配资源

第二, 通过项目立项方式确定合理的项目绩效目标, 有助于提升人员的积极性

第三, 以项目型工作方式, 提升项目实施效率。

第 37 题 整合者是项目经理承担的重要角色之一, 作为整合者, 其主要工作不包括____

- A、通过与项目干系人主动、全面的沟通, 来了解他们对项目的需求
- B、再相互竞争的众多干系人之间寻找平衡点
- C、通过认真、细致的协调, 来达到各种需求间的整合与平衡
- D、将不同厂商的产品、技术进行整合

【答案】D

【解析】中级教材第二版 P244: 整合者是项目经理承担的重要角色之一, 他要通过沟通来协调通过协调来整合。作为整合者, 项目经理必须从宏观视角来审视项目。作为整合者, 项目经理必须:

(1) 通过与项目干系人主动、全面的沟通, 来了解他们对项目的需求。

(2) 在相互竞争的众多干系人之间寻找平衡点。

(3) 通过认真、细致的协调工作, 来达到各种需求间的平衡, 实现整合

第 38 题 项目章程的主要内容不包括____

- ①项目目的或批准项目的理由
- ②项目的主要风险
- ③项目的总体预算
- ④项目总体里程碑进度计划
- ⑤项目范围说明书
- ⑥项目成本基准

- A、①②③⑥
- B、①②③④
- C、①③④⑤
- D、①④⑤⑥

【答案】B

【解析】项目章程的内容包括①②③④, 但不包括⑤⑥。

项目章程的制订主要关注记录商业需求、项目论证、对顾客需求的理解和满足这些需求的新产品服务或输出。主要内容包括：

- (1) 概括性的项目描述和项目产品描述。
- (2) 项目目的或批准项目的理由,即为什么要做这个项目
- (3) 项目的总体要求,包括项目的总体范围和总体质量要求。
- (4) 可测量的项目目标和相关的成功标准
- (5) 项目的主要风险,如项目的主要风险类别
- (6) 总体里程碑进度计划。
- (7) 总体预算
- (8) 项目的审批要求,即在项目的规划、执行、监控和收尾过程中,应该由谁来做出哪种批准
- (9) 委派的项目经理及其职责和职权。
- (10) 发起人或其他批准项目章程的人员的姓名和职权。

第 39 题 项目管理计划是说明项目将如何执行、监督和控制的文件，以下选项中，___不属于项目管理计划的内容

- A、干系人登记册
B、为项目选择的生命周期模型
C、如何监督和控制变更
D、所使用的项目管理过程

【答案】 A

【解析】A、干系人登记册是属于项目文件,不是项目管理计划。参见中级教材第二版 P250 表 6-2。

第 40 题 指的是为确保项目工作的未来绩效符合项目管理计划进行的有目的的活动。

- A、纠正措施 B、预防措施 C、缺陷补救 D、功能完善

【答案】B

【解析】大家要注意一下纠正措施、预防措施和缺陷补救的区别

- (1) 纠正措施。为使项目工作绩效重新与项目管理计划一致而进行的有目的的活动
- (2) 预防措施。为确保项目工作的未来绩效符合项目管理计划而进行的有目的的活动。
- (3) 缺陷补救。为了修正不一致的产品或产品组件而进行的有目的的活动

参见中级教材第二版 P251。

第41题 以下关于项目整体变更控制过程的叙述中, 不正确的是

- A、实施整体变更控制过程的目的是为了降低项目风险
- B、实施整体变更控制过程贯穿项目始终，并且应用于项目的各个阶段
- C、变更控制委员会对整体变更控制过程负最终责任
- D、会议是实施整体变更控制的工具与技术之一

【答案】C

【解析】中级教材第二版 P259: 实施整体变更控制过程贯穿项目始终, 并且应用于项目的各个阶段。项目经理对此负最终责任。C 是错误的。

第 42 题 以下关于项目变更管理的叙述中, 不正确的是

- A、项目的任何干系人都可以提出变更请求
B、所有的变更请求都必须以书面形式记录
C、所有的变更请求都必须交由变更控制委员会审批
D、客户也可以作为变更控制委员会成员

【答案】C

【解析】中级教材第二版 P259-260

项目的任何干系人都可以提出变更请求。尽管可以口头提出,但所有变更请求都必须以书面形式记录,并纳入变更管理以及配置管理系统中。A 和 B 是正确的

对于可能影响项目目标的变更,必须经过变更控制委员会的批准才能实施。但对于一些如内部计划等不影响

范围目标的变更,也可不需要 CCB 审批。C 是错误的

答案 D 客户也可以作为变更控制委员会成员,这个是正确。

第 43 题 以下关于工作分解结构 (WBS) 的叙述中,不正确的是____

- A、WBS 是制定进度计划,成本计划的基础
- B、项目的全部工作都必须包含在 WBS 中
- C、WBS 的编制需要主要项目干系人的参与
- D、WBS 应采用自下而上的方式,逐层确定

【答案】D

【解析】D 是明显的错误,WBS 是自上而下分解的。

第 44 题 在项目范围确认时,经常会使用群体决策技术,在以下群体决策技术中,____是根据群体中超过 50%人员的意见作出决策。

- A、一致同意原则
- B、大多数原则
- C、相对数原则
- D、独裁原则

【答案】B

【解析】中级教材第二版 P283:大多数原则。获得群体中超过 50%员的支持,就能做出决策。把参与决策的小组人数定为奇数,防止因平局而无法达成决策。

第 45 题 项目实施过程中,用户的需求可能会发生变化,例如提出新的需求,针对此状况,项目经理的正确做法是____

- A、从客户满意度的角度出发,应尽量满足用户的新需求
- B、如果需要超出预先约定的范围,应拒绝用户的新需求
- C、应根据经验判断用户的新需求是否会对项目的成本、质量、工期造成影响,如果影响可控,应满足用户的需求
- D、应启动变更控制管理流程,对用户的新需求进行评估

【答案】D

【解析】最正确、专业的做法就是走变更控制管理流程,只有 D 是正确答案。

第 46 题 ____不是规划项目进度管理的输入。

- A、项目范围说明书
- B、WBS 和 WBS 字典
- C、活动清单
- D、项目章程


【答案】C

【解析】规划项目进度管理的输入:

- 1)项目管理计划
- 2)项目章程
- 3)组织过程资产
- 4)事业环境因素

其中 A 和 B 在项目管理计划里包括,即范围基准。但 C 活动清单是定义活动的输出。

第 47 题 下图中 (单位:天) 关于活动 H 和活动 I 之间的关系描述正确的是____

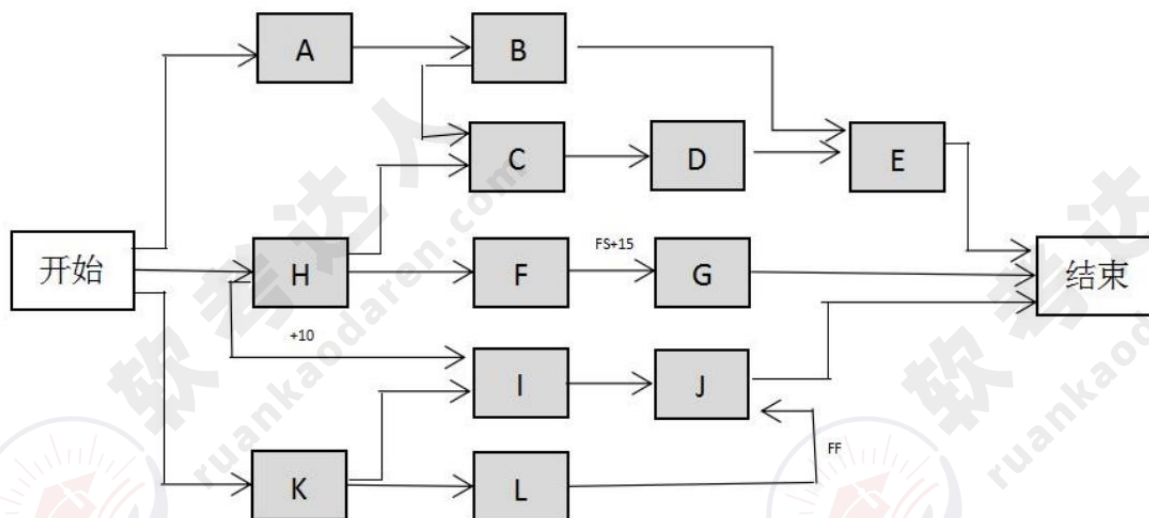


- A、活动 H 开始时，开始活动 I
B、活动 H 完成 10 天后，开始活动 I
C、活动 H 结束时，开始活动 I
D、活动 H 开始 10 天后，开始活动 I

【答案】D

【解析】H 和 I 是开始—开始关系，但有 10 天的滞后期，所以是活动 H 开始 10 天后，开始活动 I。这个是中级教材第二版 P298 上原图

第 48 题 项目经理小李在制定进度计划是采用下图所示的工具，该工具是_____

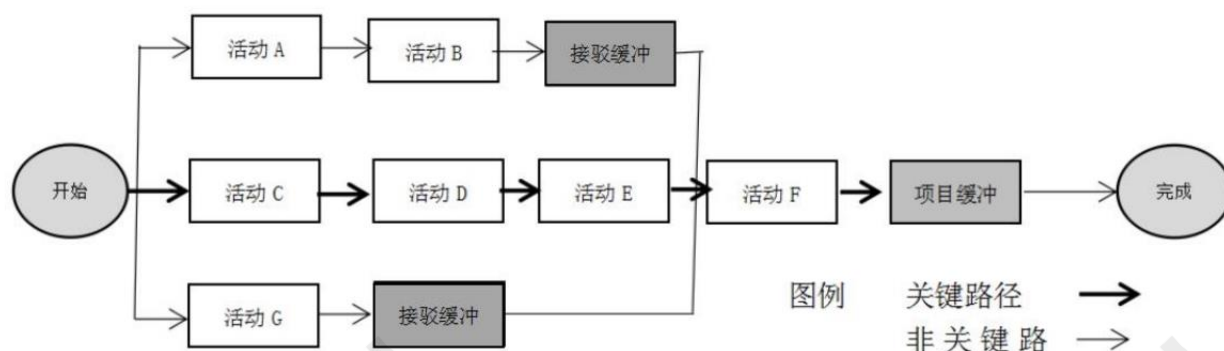

- A、关键链法 B、关键路径法 C、进度网络分析 D、建模技术

【答案】A

【解析】这个是关键链法的图，有接驳缓冲和项目缓冲。这个是中级教材第二版 P 310 上原图。

第 49 题 在制定进度计划时，可以采用多种工具与技术，如关键路径法、资源平衡技术、资源平滑技术等，在以下叙述中，不正确的是_____

- A、项目的关键路径法可能有一条或多条
B、随着项目的开发，关键路径法可能也随着不断变化
C、资源平衡技术往往会导致关键路径延长
D、资源平滑技术往往会改变项目关键路径，导致项目进度延迟

【答案】D

【解析】资源平滑对进度模型中的活动进行调整，从而使项目资源需求不超过预定的资源限制的种技术。相对于资源平衡而言，资源平滑不会改变项目关键路径，完工日期也不会延迟。D 是错误的

第 50 题 不随生产量、工作量或时间的变化而变化的非重复成本属于_____

A、固定成本 B、直接成本 C、间接成本 D、沉没成本

【答案】A

【解析】固定成本不随生产量、工作量或时间的变化而变化

第 51 题 在进行项目成本估算时，可以使用多种技术和工具，其中，_____相对于其他估算技术来说，成本较低，耗时较少，但准确性也较低。

A、专家判断 B、类比估算 C、参数估算 D、三点估算

【答案】

【解析】中级教材第二版 P333:相对于其他估算技术,类比估算通常成本较低、耗时较少,但准确性也较低

第 52 题 下表给出某信息化建设项目到 2017 年 9 月 1 日为止的成本执行(绩效)数据,基于该数据,项目经理对完工估算(EAC)进行预测,假设当前成本偏差被看作是代表未来偏差的典型偏差时,EAC 应为_____元。

活动编号	活动	完成百分比%	计划值 (PV) /元	实际成本 (AC) /元	挣值 (EV) /元
1	A	100	1000.00	1000.00	1000.00
2	B	100	2000.00	2200.00	2000.00
3	C	100	5000.00	5100.00	5000.00
4	D	80	3000.00	3200.00	2400.00
5	E	60	4000.00	4500.00	2400.00
合计			15000.00	16000.00	12800.00
项目总预算 (BAC): 50000.00					
报告日期: 2017 年 9 月 1 日					

A、45000.00 B、50000.00 C、53200.00 D、62500.00

【答案】D

【解析】典型情况可以直接用我们课程中教的快速公式 $EAC=BAC/CPI=50000/(12800/16000)=50000*16000/12800=62500$ 。

第 53 题 以下关于编制人力资源计划的工具和技术的叙述中,不正确的是_____

A、可使用多种技术描述项目的角色和职责
 B、每个工作包可分配多人负责,做好工作备份
 C、职责分配矩阵是反映团队成员与其承担工作之间联系的最直观的方法
 D、描述职责时,需要让每一位项目成员都非常清楚自己的角色和职责

【答案】B

【解析】中级教材第二版 P 375:无论采用何种形式,都要确保每一个工作包只有一个明确的责任人,而且每一个项目团队成员都非常清楚自己的角色和职责。B 是错误的。

第 54 题 可以通过多种方法实现对项目团队的管理,随着远程通讯方式的快速发展,虚拟团队成为了项目管理的方式。作为项目经理,想要管理好虚拟团队,采用_____方法更合适。

A、问题清单 B、冲突管理 C、风险管理 D、观察和交流

【答案】D

【解析】中级教材第二版 P390:观察和交谈用于随时了解团队成员的工作情况和思想状态。项目管理团队监控项目的进展,如完成了哪些可交付成果?让项目成员感到骄傲的成就有哪些?以及人际关系问题等。

如果是虚拟团队,这要求项目管理团队进行更加积极主动的、经常性的沟通,不管是面对面还是以其他合适的方式。

也就是说,做为项目经理,想要管理好虚拟团队,应更积极主动和经常性的交流和沟通。D 答案是正确的。

第 55 题 以下_____不是控制沟通的技术和方法。

A、业务数据分析 B、项目例会 C、信息管理系统 D、专家判断

【答案】A

【解析】控制沟通的工具与技术：

- 1) 信息管理系统
- 2) 专家判断
- 3) 会议

第56题 在进行项目干系人分析时，经常用到权力/利益分析法，对待属于第A区域的项目干系人，应采取的策略是____



A、随时告知 B、令其满意 C、花较少的精力 D、争取支持

【答案】B

【解析】第A区域权力高、利益低的，应采取的策略是令其满意。这部分近几年几乎每次必考，大家要认真看一下教材上的详细描述，参见中级教材第二版P425-426：

1. 首先关注处于B区的干系人，他们对项目有很高的权力，也很关注项目的结果，项目经理应该“重点管理，及时报告”，应采取有力的行动让B区干系人满意。项目的客户和项目经理的主管领导就是这样的项目干系人
2. 尽管C区干系人权力低，但关注项目的结果，因此项目经理要“随时告知”项目状况，以维持C区的干系人的满意程度。如果低估了C区干系人的利益，可能产生危险的后果，能会引起C区干系人的反对。大多数情况下，要全面考虑到C区干系人对项目可能的、长期的以及特定事件的反应处于C区的干系人，项目经理应该“随时告知他们项目的状态，保持及时的沟通”。
3. 方格区域A的关键干系人具有“权力大、对项目结果关注度低”的特点，因此争取A区干系人的支持，对项目的成功至关重要，项目经理对A区干系人的管理策略应该是“令其满意”
4. 最后，还需要正确地对D区中的干系人的需要，D区干系人的特点是“权力低、对项目结果的关注度低”，因此项目经理主要是通过“花最少的精力来监督他们”即可。但有些D区的干系人可以影响更有权力的干系人，他们对项目发挥的是间接作用，因此对他们的态度也应该“要好些”，以争取他们的支持、降低他们的敌意

第57题 某系统集成商中标一个县政府办公系统的开发项目，该项目在招标时已经明确确定该项目的经费不超过150万元，此项目适合签订____

A、工料合同 B、成本补偿合同 C、分包合同 D、总价合同

【答案】D

【解析】有总价上限，那就是总价合同了。

第58题 某系统集成商中标一个县政府办公系统的开发项目，在合同执行过程中，县政府提出在办公系统

中增加人员考勤管理的模块，由于范围发生变化，合同管理人员需要协调并重新签订合同，该合同的管理内容属于_____

- A、合同签订管理 B、合同履行管理 C、合同变更管理 D、合同档案管理

【答案】C

【解析】范围变化重新签订合同，是属于合同变更管理的内容。

第 59 题 对于提供长期（一般为 3 年）涉外人力资源外包服务的软件企业，面对国际金融汇率波动较大和区域人力资源成本攀升速度较快的情况，应于客户签订_____类合同。

- A、固定总价合同 B、成本补偿合同 C、工料合同 D、总价加经济价格调整合同

【答案】D

【解析】总价加经济价格调整合同它是一种特殊的总价合同，允许根据条件变化（如通货膨胀、某些特殊商品的成本增加或降低），以事先确定的方式对合同价格进行最终调整。中级教材第二版 P465

第 60 题 以下关于说明书（SOW）的叙述中，不正确的是_____

- A、SOW 的内容主要包括服务范围、方法、假定、工作量、变更管理等
B、内部的 SOW 有时可称为任务书
C、SOW 的变更应由项目变更控制过程进行管理
D、SOW 通过明确项目应该完成的工作来确定项目范围

【答案】D

【解析】中级教材第二版 P473: 工作说明书 (Sow) 是对项目所要提供的产品、成果或服务的描述。对内部项目而言，项目发起者或投资人基于业务需要、产品或服务的需求提出工作说明书。内部的工作说明书有时也叫任务书。工作说明书包括的主要内容有前言、服务范围、方法、假定、服务期限和工作量估计、双方角色和责任、交付资料、完成标准、顾问组人员、收费和付款方式、变更管理等。A 和 B 都是正确的。

C 答案 SOW 的变更应由项目变更控制过程进行管理也是对的，比如采购工作说明书是采购规划的输出，如果需要变更，也应走变更控制过程来管理。

中级教材第二版 P474: 工作说明书与项目范围说明书的区别: 工作说明书是对项目所要提供的产品或服务的叙述性的描述; 项目范围说明书则通过明确项目应该完成的工作来确定项目的范围。答案 D 是错误的

第 61 题 项目验收时发现项目经理签字确认的《需求规格说明书》纸质文档内容与配置服务器上的产品库同一文档内容不一致，最有可能是在_____的执行上出现了问题。

- A、文档管理规范 B、文档目录与标准 C、文档书写规范 D、图标编号规则

【答案】A

【解析】这种题目从常识判断即可。BCD 都是具体的文档编书要求规范标准这些，与文档内容不致关系不大。最有可能就是文档管理规范或及执行出了问题。比如，没有做好文档权限、配置管理等

第 62 题 某软件开发项目的《概要设计说明书》版本号为 v2.13，该配置项的状态是_____

- A、首次发布 B、正在修改 C、正式发布 D、草稿

【答案】

【解析】配置版本管理的常识题了，必须要掌握的。

- 处于“草稿”状态的配置项的版本号格式为: 0.YZ。
- YZ 数字范围为 01~99
- 随着草稿的不断完善, YZ 的取值应递增。YZ 的初值和增幅由开发者自己把握
- 处于“正式发布”状态的配置项的版本号格式为: X.Y
- X 为主版本号, 取值范围为 1~9。Y 为次版本号, 取值范围为 1~9
- 配置项第一次“正式发布”时, 版本号为 10。
- 如果配置项的版本升级幅度比较小, 一般只增大 Y 值, X 值保持不变。只有当配置项版本升级幅度比较大时, 才允许增大 X 值。
- 处于“正在修改”状态的配置项的版本号格式为: X.YZ。配置项正在修改时, 般只增大 Z 值, X.Y 值保持不

变。当配置项修改完毕，状态称为“正式”时，将Z值设置为0，增加X.Y值。例如，当前版本为1.1，则1.1修改的版本为1.11，改完后为1.2版本。

- 配置项在修改时，一般只增大Z值，XY值保持不变。
- 当配置项修改完毕，状态重新成为“正式发布”时，将Z值设置为0，增加X.Y值

第63题 质量管理发展过程中，从____开始，质量管理从“对已完成产品的事后检验”提前到“对产品生产过程中的全过程监控”。

- A、手工艺人时代 B、质量检验阶段 C、统计质量控制阶段 D、全面质量管理阶段

【答案】D

【解析】ABC都是比较早期的质量发展阶段，只有全面质量管理阶段符合题意：质量管理从“对已完成产品的事后检验”提前到“对产品生产过程中的全过程监控”。全面质量管理就是以产品质量为核心，建立起一套科学严密高效的质量体系，以提供满足用户需要的产品或服务的全部活动。

第64题 ____属于质量管理中规划质量过程的工具和技术。

- A、成本效益分析法 B、质量审计 C、控制图 D、甘特图

【答案】A

【解析】1 成本效益分析是规划质量过程的工具和技术。这个是最正确的答案

第65题 在进度管理中常用的活动网络图，如计划评审技术（PERT），关键路径法等，也可以应用于质量管理的____过程中。

- A、规划质量管理 B、实施质量保证 C、质量控制 D、质量改造

【答案】

【解析】在中级教材第二版P367页实施质量保证工具里提到的新七工具中就包括活动网络图。

第66题 识别风险过程的主要输出就是风险登记册，风险登记册始于识别风险过程，在项目实施过程中供其他风险管理过程和项目管理过程使用，风险登记册中的____内容是识别风险过程中产生的。

- A、风险紧迫性或风险分类 B、已识别的风险清单 C、商定的应当策略 D、风险责任人及其职责

【答案】B

【解析】在中级教材第二版P557：最初的风险登记册包括如下信息

1) 已识别风险清单

2) 潜在应对措施清单

第67题 项目经理张工在项目风险管理过程中，使用如下公式进行风险评估：风险值=风险发生的概率*风险发生后的后果 该项目分析管理处于____阶段。

- A、识别风险 B、实施定性风险分析 C、实施定量风险分析 D、规划风险应对

【答案】B

【解析】这是概率和影响评估，即定性风险分析。

第68题 风险相关的项目文件随着定量风险分析产生的信息而更新，____不是在定量风险分析过程中产生的。

- A、风险评级和分值 B、量化风险优先级清单
C、项目的概率分析 D、实现成本和时间目标的概率

【答案】A

【解析】中级教材第二版P566-567：定量风险分析后风险登记册更新：

1. 项目的概率分析

2. 实现成本和时间目标的概率

3. 量化风险优先级清单

4. 定量风险分析结果的趋势

第69题 应用系统运行中涉及的安全和保密层次包括系统级安全，资源访问安全，功能性安全和数据域安全，针对应用系统安全管理，首先要考虑____

A、系统级安全 B、资源访问安全 C、功能性安全 D、数据域安全

【答案】A

【解析】应用系统运行中涉及的安全和保密层次包括系统级安全、资源访问安全、功能性安全和数据域安全。这4个层次的安全,按粒度从大到小的排序是:系统级安全、资源访问安全、功能性安全、数据域安全。按排序首先要考虑就是系统级的安全,系统级安全是应用系统的第一道防护大门。

第70题 以下关于政府采购的说法,不正确的是_____

- A、为在中国境外使用而进行采购的,可以不采购本国货物、工程和服务
- B、两个以上的自然人,法人或者其他组织可以组成一个联合体,以一个供应商的身份共同参与政府采购
- C、招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的,可以采用单一来源采购方式采购
- D、公开招标应作为政府采购的主要采购方式

【答案】C

【解析】招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的,可以采用竞争性谈判。而不是单一来源采购。参见政府采购法:

第三十条符合下列情形之一的货物或者服务,可以依照本法采用竞争性谈判方式采购

- (一) 招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的
- (二) 技术复杂或者性质特殊,不能确定详细规格或者具体要求的;
- (三) 采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的
- (四) 不能事先计算出价格总额的

第71题 Retail firms analyze sales trends and user preference through internet user data, This belongs to ____ application area.


- A、big data B、cloud computing C、internet of things D、artificial intelligence

【答案】A

【解析】零售公司通过互联网用户数据分析消费者的销售趋势和用户偏好,属于()应用领域。

- A、大数据 B、云计算 C、物联网 D、人工智能

第72题 In the following cloud computing technology architecture, ____ represented by number 3.



- A、Paas B、Saas C、IaaS D、cloud platform interface

【答案】B

【解析】在下面的云计算技术体系结构中,()用数字3表示

- A、PaaS
- B、SaaS
- C、IaaS
- D、云平台界面

参见中级教材第二版 P93, 图 1-23, 1、2、3 分别是 IaaS、PaaS、SaaS

第73题 The seven basic quality tools are used within in the context of the PDCA Cycle to solve quality-related problems, These tools are used in ____ in the following processes.

- A、plan quality management B、perform quality assurance
- C、perform quality control D、perform quality improvement

【答案】C

【解析】七个基本的质量工具在 PDCA 循环中用于解决与质量相关的问题。这些工具在 () 中用于以下过程

- A、计划质量管理
- B、执行质量保证
- C、进行质量控制
- D、进行质量改进

七个基本质量工具主要还是用在质量控制中, 所以 C 是最正确的答案。

第 74 题 ____ is the process of implementing risk response plans, tracking identified risks, monitoring residual risk, identifying new risk, and evaluating risk process effectiveness throughout the project.

- A、Identity risks
- B、Control risks
- C、Plan risk responses
- D、Plan risk management

【答案】B

【解析】() 是实施风险应对计划, 追踪已识别风险, 监测残余风险, 识别新风险, 评估整个项目风险过程有效性的过程。

- A、身份风险
- B、控制风险
- C、计划风险回应
- D、计划风险管理

这个就是控制风险的定义。

第 75 题 ____ is the approved version of the time-phased project budget, excluding any management reserves, which can only be changed through formal change control procedures and is used as a basis for comparison to actual results.

- A、The control accounts
- B、Funding requirement
- C、The cost estimates
- D、The cost baseline

【答案】D

【解析】() 是时间阶段项目预算的批准版本, 不包括任何管理储备, 只能通过正式变更控制程序进行更改, 并作为与实际结果比较的依据。

- A、控制账户
- B、资金需求
- C、成本估算
- D、成本基准

成本基准不包括管理储备, 只能通过正式变更控制程序进行更改, 并作为与实际结果比较的依据。
